



Engenharia e Representação Ltda

**Engenharia e Representação LTDA**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIO E CONTRATOS e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

NESTA

Prezados Senhores:

A empresa INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, firma estabelecida nesta cidade sito Rua Pixinguinha nº 61, Bairro Pedrinhas – CEP 76.801-448 em Porto Velho – RO, com Inscrição no CNPJ nº 30.106.351/0001-42, vem mui respeitosamente requerer o pagamento da medição no valor de R\$ 51.652,58 (Cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente a NOTA FISCAL nº 357, da 2ª Medição das Obras da Reforma da Unidade de saúde da família de São Sebastião - CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento

Porto velho, 14 de julho de 2023

  
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL  
RN Nº 44983654-0 CREA-AM



**PREFEITURA DE MANAUS**  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da  
Informação - SEMEF

\*notamanaus

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <b>nota.manaus.am.gov.br</b> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>38BA.312F.FAFO</b>	Data/Hora da emissão <b>26/07/2023 - 17:17:43</b>
	Natureza da operação <b>Recolhimento Fora</b>	Número da Nota <b>357</b>

**Prestador de Serviços**

	<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA</b>	
	DAS COPAIBAS, 161, COROADO, Telefone: 92 92703957. CEP 69082663 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 30.106.351/0001-42 Email ADMIN@ANTONYCONTABILIDADE.COM.BR	
	Inscrição Municipal	40649901
	Inscrição Estadual	

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	
CPF/CNPJ	05.903.125/0001-45	
Endereço	AV SETE DE SETEMBRO, 237,	
Bairro	CENTRO, Telefone: 6939013634.	
Cep	76.801-04	
Cidade	PORTO VELHO - RO - BRASIL	Inscrição Municipal
Email		Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO. - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Banco: Caixa Econômica Federal Ag: 1300 OP: 003 C/C:00002864-7.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
51.652,58	1,00	0,00	0,00	51.652,58	0,00	0,00	51.652,58

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.652,58****Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	51.652,58

**Outras Informações**

- Competência: Julho/2023- Serviço Tributado no Município: PORTO VELHO - RO- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO	
	<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
	<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
	<b>DATA:</b> 24/04/23	
	<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
	<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
	<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%
-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 17.739,02</b>		<b>ETAPA 1.0 → R\$ 10.758,97</b>		
<b>Instalações de água fria</b>							<b>R\$ 17.739,02</b>		<b>SUBETAPA Instalações de água fria R\$ 10.758,97</b>		
1.1	CP0701SB	A	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88	R\$ 314,82	R\$ 906,69	0,13 %	0,00	0,00%	R\$ -
1.2	93584	A	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9,00	R\$ 785,19	R\$ 7.066,68	1,03 %	9,00	100,00%	R\$ 7.066,68
1.3	CP0370SB	A	Taxas e emolumentos	und	1,00	R\$ 1.449,01	R\$ 1.449,01	0,21 %	0,00	0,00%	R\$ -
1.4	98458	A	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	30,12	R\$ 91,98	R\$ 2.770,29	0,40 %	30,12	100,00%	R\$ 2.770,29
1.5	CP0001SB	A	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	75,87	R\$ 12,15	R\$ 922,00	0,13 %	75,87	100,00%	R\$ 922,00
1.6	6PC	D	PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	R\$ 4.624,35	R\$ 4.624,35	0,67 %	0,00	0,00%	R\$ -
<b>2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>							<b>R\$ 23.969,05</b>		<b>ETAPA 2.0 → R\$ 20.510,33</b>		
2.1	CP0338SB	C	Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)	mês	7,00	R\$ 3.424,15	R\$ 23.969,05	3,49 %	5,99	85,57%	R\$ 20.510,33
<b>3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>R\$ 13.844,19</b>		<b>ETAPA 3.0 → R\$ 7.751,04</b>		
3.1	CP0005SB	C	Demolição de Concreto Simples	m³	8,90	R\$ 292,57	R\$ 2.603,87	0,38 %	6,12	68,76%	R\$ 1.790,54
3.2	97631	A	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	364,07	R\$ 3,00	R\$ 1.091,55	0,16 %	244,07	67,02%	R\$ 731,55
3.3	CP0006SB	A	Retirada de meio fio com empilhamento	m	25,01	R\$ 9,22	R\$ 230,66	0,03 %	25,01	100,00%	R\$ 230,66
3.4	CP0008SB	C	Remoção de Pintura	m²	457,13	R\$ 10,35	R\$ 4.731,84	0,69 %	140,92	30,84%	R\$ 1.459,08
3.5	97622	A	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	7,40	R\$ 52,13	R\$ 385,78	0,06 %	1,73	23,38%	R\$ 90,21
3.6	97640	A	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	376,03	R\$ 1,60	R\$ 600,14	0,09 %	154,78	41,02%	R\$ 246,15
3.7	CP0705SB	A	Apicoamento manual de superfície de concreto	m²	81,48	R\$ 8,05	R\$ 655,78	0,10 %	81,48	100,00%	R\$ 655,78
3.8	97633	A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	51,95	R\$ 20,95	R\$ 1.088,52	0,16 %	48,81	93,96%	R\$ 1.022,74
3.9	97644	A	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,64	R\$ 20,95	R\$ 809,63	0,12 %	19,56	50,63%	R\$ 409,91
3.10	97645	A	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,84	R\$ 29,73	R\$ 441,21	0,06 %	5,08	34,24%	R\$ 151,05
3.11	97663	A	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00	R\$ 11,01	R\$ 99,11	0,01 %	7,00	77,78%	R\$ 77,09

PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		
01/05/23	A	16/07/23
2ª MEDIÇÃO		
QUANT.	%	VALOR
ETAPA 1.0 →		R\$ -
SUBETAPA Instalações de água fria		R\$ -
	0,00%	R\$ -
ETAPA 2.0 →		R\$ 1.742,54
0,51	7,27%	R\$ 1.742,54
ETAPA 3.0 →		R\$ 4.112,36
0,89	10,00%	R\$ 260,38
120,00	32,98%	R\$ 360,00
-	-	-
257,79	56,39%	R\$ 2.668,12
3,78	51,08%	R\$ 197,05
108,79	29,00%	R\$ 174,06
	0,00%	R\$ -
3,14	6,04%	R\$ 65,78
9,00	23,29%	R\$ 188,55
4,00	26,95%	R\$ 118,92
2,00	22,22%	R\$ 22,02

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO
	<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO
	<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO
	<b>DATA:</b> 24/04/23
	<b>ÚLT. ATUAL:</b>
	<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO
	<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA
	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%
	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%
-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23	
3.12	97664	A	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00	R\$ 1,37	R\$ 19,15	0,00 %	12,00	85,69%	R\$ 16,41	2,00	14,31%	R\$ 2,74	
3.13	97666	A	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	R\$ 8,03	R\$ 80,26	0,01 %	8,00	79,99%	R\$ 64,20	2,00	20,01%	R\$ 16,06	
3.14	97647	A	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,46	R\$ 3,11	R\$ 13,88	0,00 %	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	
3.15	CP0362SB	C	Remoção de Bancada de Granito	m²	14,57	R\$ 22,49	R\$ 327,71	0,05 %	12,85	88,20%	R\$ 289,03	1,72	11,80%	R\$ 38,68	
3.16	CP0007SB	A	Retirada de grama	m²	16,57	R\$ 5,03	R\$ 83,30	0,01 %	16,57	100,00%	R\$ 83,30		0,00%	R\$ -	
3.17	72898	A	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	36,21	R\$ 4,10	R\$ 148,61	0,02 %	0,00	0,10%	R\$ 0,15		0,00%	R\$ -	
3.18	95876	A	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	287,87	R\$ 1,50	R\$ 433,19	0,06 %	287,87	100,00%	R\$ 433,19		0,00%	R\$ -	
<b>4.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 4.117,77</b>		<b>ETAPA 4.0 → R\$ 4.117,77</b>			<b>ETAPA 4.0 → R\$ -</b>			
4.1	93358	A	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	9,32	R\$ 79,59	R\$ 741,82	0,11 %	9,32	100,00%	R\$ 741,82		0,00%	R\$ -	
4.2	96995	A	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,66	R\$ 48,26	R\$ 321,39	0,05 %	6,66	100,00%	R\$ 321,39		0,00%	R\$ -	
4.3	CP0012SB	C	Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada.	m³	0,53	R\$ 75,86	R\$ 40,20	0,01 %	0,53	100,00%	R\$ 40,20		0,00%	R\$ -	
4.4	CP0013SB	C	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm	m³	4,96	R\$ 607,73	R\$ 3.014,36	0,44 %	4,96	100,00%	R\$ 3.014,36		0,00%	R\$ -	
<b>5.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>R\$ 7.964,07</b>		<b>ETAPA 5.0 → R\$ 7.964,07</b>			<b>ETAPA 5.0 → R\$ -</b>			
5.1	96616	A	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,26	R\$ 667,16	R\$ 173,46	0,03 %	0,26	100,00%	R\$ 173,46		0,00%	R\$ -	
5.2	CP0704SB	A	Fornecimento / instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m³	2,66	R\$ 38,65	R\$ 102,80	0,01 %	2,66	100,00%	R\$ 102,80		0,00%	R\$ -	
5.3	96536	A	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,55	R\$ 57,21	R\$ 260,28	0,04 %	4,55	100,00%	R\$ 260,28		0,00%	R\$ -	
5.4	92269	A	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	16,88	R\$ 131,28	R\$ 2.216,05	0,32 %	16,88	100,00%	R\$ 2.216,05		0,00%	R\$ -	
5.5	96543	A	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,80	R\$ 21,55	R\$ 728,25	0,11 %	33,80	100,00%	R\$ 728,25		0,00%	R\$ -	
5.6	96545	A	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,30	R\$ 19,07	R\$ 1.169,13	0,17 %	61,30	100,00%	R\$ 1.169,13		0,00%	R\$ -	
5.7	96546	A	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,20	R\$ 17,03	R\$ 1.263,74	0,18 %	74,20	100,00%	R\$ 1.263,74		0,00%	R\$ -	
5.8	94965	A	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,59	R\$ 564,60	R\$ 1.462,30	0,21 %	2,59	100,00%	R\$ 1.462,30		0,00%	R\$ -	
5.9	92873	A	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,59	R\$ 200,88	R\$ 520,28	0,08 %	2,59	100,00%	R\$ 520,28		0,00%	R\$ -	

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO
	<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO
	<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO
	<b>DATA:</b> 24/04/23
	<b>ÚLT. ATUAL:</b>
	<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO
	<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA
	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%
	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%
-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23
5.10	CP0712SB	A	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m³	5,69	R\$ 11,91	R\$ 67,78	0,01 %	5,69	100,00%	R\$ 67,78			
<b>6.0 SUPER ESTRUTURA</b>									<b>ETAPA 6.0 → R\$ 9.427,05</b>			<b>ETAPA 6.0 → R\$ -</b>		
6.1	92269	A	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	6,24	R\$ 131,28	R\$ 819,20	0,12 %	6,24	100,00%	R\$ 819,20		0,00%	R\$ -
6.2	92270	A	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	26,03	R\$ 105,64	R\$ 2.749,91	0,40 %	26,03	100,00%	R\$ 2.749,91		0,00%	R\$ -
6.3	92271	A	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	5,63	R\$ 59,31	R\$ 333,94	0,05 %	5,63	100,00%	R\$ 333,94		0,00%	R\$ -
6.4	73301	A	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	14,64	R\$ 10,83	R\$ 158,55	0,02 %	14,64	100,00%	R\$ 158,55		0,00%	R\$ -
6.5	92775	A	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	38,23	R\$ 21,72	R\$ 830,24	0,12 %	38,23	100,00%	R\$ 830,24		0,00%	R\$ -
6.6	92776	A	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	50,13	R\$ 20,43	R\$ 1.024,10	0,15 %	50,13	100,00%	R\$ 1.024,10		0,00%	R\$ -
6.7	92777	A	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	15,20	R\$ 19,10	R\$ 290,24	0,04 %	15,20	100,00%	R\$ 290,24		0,00%	R\$ -
6.8	92778	A	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	19,00	R\$ 17,00	R\$ 322,95	0,05 %	19,00	100,00%	R\$ 322,95		0,00%	R\$ -
6.9	92784	A	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,90	R\$ 19,27	R\$ 152,20	0,02 %	7,90	100,00%	R\$ 152,20		0,00%	R\$ -
6.10	92785	A	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,10	R\$ 18,55	R\$ 502,65	0,07 %	27,10	100,00%	R\$ 502,65		0,00%	R\$ -
6.11	94965	A	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,31	R\$ 564,60	R\$ 1.304,22	0,19 %	2,31	100,00%	R\$ 1.304,22		0,00%	R\$ -
6.12	92873	A	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,31	R\$ 200,88	R\$ 464,03	0,07 %	2,31	100,00%	R\$ 464,03		0,00%	R\$ -
6.13	98546	A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	5,63	R\$ 84,34	R\$ 474,82	0,07 %	5,63	100,00%	R\$ 474,82		0,00%	R\$ -
<b>7.0 ALVENARIA</b>									<b>ETAPA 7.0 → R\$ 17.130,49</b>			<b>ETAPA 7.0 → R\$ 275,39</b>		
7.1	CP0016SB	C	Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m²	110,64	R\$ 78,91	R\$ 8.730,69	1,27 %	66,93	60,49%	R\$ 5.281,54	3,49	3,15%	R\$ 275,39
7.2	CP0339SB	C	Parede com placas cimenticias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples sem vãos	m²	21,66	R\$ 185,95	R\$ 4.027,58	0,59 %	21,66	100,00%	R\$ 4.027,58		0,00%	R\$ -
7.3	CP0341SB	C	Parede com placas cimenticias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples com vãos	m²	39,27	R\$ 199,17	R\$ 7.821,38	1,14 %	39,27	100,00%	R\$ 7.821,38		0,00%	R\$ -
7.4	95465	A	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	11,04	R\$ 103,73	R\$ 1.145,16	0,17 %	0,00	0,00%	R\$ (0,01)		0,00%	R\$ -
<b>8.0 COBERTURA</b>									<b>ETAPA 8.0 → R\$ 105.734,40</b>			<b>ETAPA 8.0 → R\$ 8.094,91</b>		
8.1	CP0017SB	A	Fornecimento e montagem de estrutura metálica com aço estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36	kg	5.153,43	R\$ 14,61	R\$ 75.316,35	10,97 %	5.153,43	100,00%	R\$ 75.316,35		0,00%	R\$ -



	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO
	<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO
	<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO
	<b>DATA:</b> 24/04/23
	<b>ÚLT. ATUAL:</b>
	<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO
	<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA
	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%
	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%
-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23
10.3	87529	A	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	m²	388,60	R\$ 35,08	R\$ 13.631,23	1,99 %	308,78	79,46%	R\$ 10.831,16	48,60	12,51%	R\$ 1.704,88
10.4	87269	A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA	m²	151,79	R\$ 59,90	R\$ 9.091,55	1,32 %	151,79	100,00%	R\$ 9.091,55		0,00%	R\$ -
10.5	87271	A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS	m²	112,69	R\$ 66,84	R\$ 7.532,00	1,10 %	112,69	100,00%	R\$ 7.532,00		0,00%	R\$ -
10.6	CP0394SB	C	Revestimento em porcelanato acetinado tipo amadeirado	m²	19,56	R\$ 129,37	R\$ 2.530,42	0,37 %	19,56	100,00%	R\$ 2.530,42		0,00%	R\$ -
<b>11.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 164.081,75</b>		<b>ETAPA 11.0 → R\$ 152.777,36</b>			<b>ETAPA 11.0 → R\$ 6.926,13</b>		
11.1	90843	A	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UN	15,00	R\$ 729,71	R\$ 10.945,71	1,59 %	6,00	40,00%	R\$ 4.378,32	3,00	20,00%	R\$ 2.189,13
11.2	90844	A	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UN	8,00	R\$ 789,50	R\$ 6.315,96	0,92 %	2,00	25,00%	R\$ 1.578,96	6,00	75,00%	R\$ 4.737,00
11.3	91341	A	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	R\$ 994,54	R\$ 3.978,14	0,58 %	4,00	100,00%	R\$ 3.978,14		0,00%	R\$ -
11.4	CP0023SB	C	Porta de alumínio tipo abrir 90x210cm, incluso barra de apoio - fornecimento e instalação	und	2,00	R\$ 2.196,61	R\$ 4.393,22	0,64 %	2,00	100,00%	R\$ 4.393,22		0,00%	R\$ -
11.5	CP0407SB	C	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,80 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	2,00	R\$ 224,12	R\$ 448,25	0,07 %	2,00	100,00%	R\$ 448,25		0,00%	R\$ -
11.6	CP0528SB	C	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,55 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 191,22	R\$ 191,22	0,03 %	1,00	100,00%	R\$ 191,22		0,00%	R\$ -
11.7	CP0640SB	C	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,20 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	2,00	R\$ 276,76	R\$ 553,52	0,08 %	2,00	100,00%	R\$ 553,52		0,00%	R\$ -
11.8	CP0641SB	C	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,60 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	4,00	R\$ 329,40	R\$ 1.317,61	0,19 %	4,00	100,00%	R\$ 1.317,61		0,00%	R\$ -
11.9	COMP-34	B	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UNID	1,00	R\$ 2.040,39	R\$ 2.040,39	0,30 %	1,00	100,00%	R\$ 2.040,39		0,00%	R\$ -
11.10	CP0646SB	C	Vidro fixo temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios.	m²	5,61	R\$ 354,78	R\$ 1.990,31	0,29 %	5,61	100,00%	R\$ 1.990,31		0,00%	R\$ -
11.11	84088	A	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,95	R\$ 132,92	R\$ 1.455,52	0,21 %	10,95	100,00%	R\$ 1.455,52		0,00%	R\$ -
11.12	CP0405SB	C	Lembrete de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm	und	34,00	R\$ 114,59	R\$ 3.896,16	0,57 %	34,00	100,00%	R\$ 3.896,16		0,00%	R\$ -
11.13	CP0697SB	C	Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura.	m²	268,31	R\$ 410,40	R\$ 110.114,42	16,04 %	268,31	100,00%	R\$ 110.114,42		0,00%	R\$ -
11.14	99855	A	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	22,60	R\$ 107,25	R\$ 2.423,88	0,35 %	22,60	100,00%	R\$ 2.423,88		0,00%	R\$ -
11.15	99839	A	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM	M	22,60	R\$ 483,11	R\$ 10.918,27	1,59 %	22,60	100,00%	R\$ 10.918,27		0,00%	R\$ -
11.16	CP0680SB	C	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	m²	1,47	R\$ 470,83	R\$ 692,12	0,10 %	1,47	100,00%	R\$ 692,12		0,00%	R\$ -
11.17	CP0069SB	C	Bancada de mármore polido branco e=3,0cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação.	m	3,99	R\$ 400,64	R\$ 1.598,56	0,23 %	3,99	100,00%	R\$ 1.598,56		0,00%	R\$ -

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO
<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
<b>DATA:</b> 24/04/23	
<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%
-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR
11.18	CP0698SB	C	Placa adesivada em PVC, com brasão do município de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação	und	1,00	R\$ 236,58	R\$ 236,58	0,03 %	1,00	100,00%	R\$ 236,58
11.19	CP0594SB	A	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	m²	1,25	R\$ 457,53	R\$ 571,91	0,08 %	1,25	100,00%	R\$ 571,91
<b>12.0 PINTURA PINTURA</b>							<b>R\$ 48.128,36</b>		<b>ETAPA 12.0 → R\$ 28.702,94</b>		
12.1	88497	A	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	635,00	R\$ 13,53	R\$ 8.592,69	1,25 %	243,21	38,31%	R\$ 3.291,78
12.2	88489	A	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.191,09	R\$ 15,54	R\$ 18.507,39	2,70 %	613,30	51,49%	R\$ 9.528,54
12.3	88496	A	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	379,58	R\$ 25,21	R\$ 9.567,47	1,39 %	270,79	71,33%	R\$ 6.824,88
12.4	88488	A	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	379,58	R\$ 17,37	R\$ 6.594,67	0,96 %	270,79	71,35%	R\$ 4.704,99
12.5	73739/001	A	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	97,02	R\$ 19,25	R\$ 1.868,08	0,27 %	70,35	72,52%	R\$ 1.354,69
12.6	100757	A	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	74,84	R\$ 40,06	R\$ 2.998,06	0,44 %	74,84	100,00%	R\$ 2.998,06
<b>13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							<b>R\$ 55.283,50</b>		<b>ETAPA 13.0 → R\$ 55.283,50</b>		
<b>Instalações de água fria</b>							<b>R\$ 8.786,91</b>		<b>SUBETAPA Instalações de água fria R\$ 8.786,91</b>		
13.1	89356	A	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,42	R\$ 19,48	R\$ 1.566,79	0,23 %	80,42	100,00%	R\$ 1.566,79
13.2	89357	A	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 27,39	R\$ 219,15	0,03 %	8,00	100,00%	R\$ 219,15
13.3	89449	A	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,48	R\$ 16,04	R\$ 376,61	0,05 %	23,48	100,00%	R\$ 376,61
13.4	89503	A	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 22,39	R\$ 44,78	0,01 %	2,00	100,00%	R\$ 44,78
13.5	89395	A	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 11,18	R\$ 156,57	0,02 %	14,00	100,00%	R\$ 156,57
13.6	89396	A	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 18,80	R\$ 75,19	0,01 %	4,00	100,00%	R\$ 75,19
13.7	89627	A	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 18,96	R\$ 227,50	0,03 %	12,00	100,00%	R\$ 227,50
13.8	89362	A	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 8,01	R\$ 192,34	0,03 %	24,00	100,00%	R\$ 192,34
13.9	89366	A	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 14,58	R\$ 29,16	0,00 %	2,00	100,00%	R\$ 29,16
13.10	CP0029SB	C	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.	und	23,00	R\$ 13,44	R\$ 309,13	0,05 %	23,00	100,00%	R\$ 309,13
13.11	CP0030SB	C	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.	und	2,00	R\$ 11,24	R\$ 22,48	0,00 %	2,00	100,00%	R\$ 22,48

PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		
01/05/23	A	16/07/23
<b>2ª MEDIÇÃO</b>		
QUANT.	%	VALOR
1,00	0,00%	R\$ -
1,25	0,00%	R\$ -
<b>ETAPA 12.0 →</b>		<b>R\$ 12.453,65</b>
257,79	40,59%	R\$ 3.487,89
257,79	21,65%	R\$ 4.006,05
108,79	28,67%	R\$ 2.742,59
108,79	28,65%	R\$ 1.889,68
17,01	17,53%	R\$ 327,44
<b>ETAPA 13.0 →</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SUBETAPA Instalações de água fria</b>		<b>R\$ -</b>
		R\$ -

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO	
	<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
	<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
	<b>DATA:</b> 24/04/23	
	<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
	<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
	<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23		
											2ª MEDIÇÃO					
											QUANT.	%	VALOR			
13.12	89972	A	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 45,51	R\$ 682,63	0,10 %	15,00	100,00%	R\$ 682,63					
13.13	99635	A	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	R\$ 192,06	R\$ 192,06	0,03 %	1,00	100,00%	R\$ 192,06					
13.14	90443	A	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,86	R\$ 11,71	R\$ 1.180,85	0,17 %	100,86	100,00%	R\$ 1.180,85					
13.15	CP0042SB	A	Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média).	m	100,86	R\$ 7,92	R\$ 799,11	0,12 %	100,86	100,00%	R\$ 799,11					
13.16	90444	A	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	43,23	R\$ 25,79	R\$ 1.114,76	0,16 %	43,23	100,00%	R\$ 1.114,76					
13.17	90445	A	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	19,56	R\$ 27,53	R\$ 538,51	0,08 %	19,56	100,00%	R\$ 538,51					
13.18	90446	A	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	18,02	R\$ 29,91	R\$ 539,04	0,08 %	18,02	100,00%	R\$ 539,04					
13.19	CP0043SB	C	Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, com lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento.	m²	16,16	R\$ 32,19	R\$ 520,25	0,08 %	16,16	100,00%	R\$ 520,25					
<b>Instalações de esgoto</b>							<b>R\$ 8.113,98</b>		<b>SUBETAPA Instalações de esgoto</b>		<b>R\$ 8.113,98</b>		<b>SUBETAPA Instalações de esgoto</b>		<b>R\$ -</b>	
13.20	89711	A	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,09	R\$ 17,72	R\$ 621,64	0,09 %	35,09	100,00%	R\$ 621,64					
13.21	89712	A	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,70	R\$ 26,47	R\$ 1.289,13	0,19 %	48,70	100,00%	R\$ 1.289,13					
13.22	89714	A	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	53,53	R\$ 51,62	R\$ 2.763,18	0,40 %	53,53	100,00%	R\$ 2.763,18					
13.23	89785	A	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 20,50	R\$ 61,49	0,01 %	3,00	100,00%	R\$ 61,49					
13.24	89797	A	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 43,56	R\$ 43,56	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 43,56					
13.25	CP0044SB	C	Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação.	und	9,00	R\$ 36,96	R\$ 332,63	0,05 %	9,00	100,00%	R\$ 332,63					
13.26	89784	A	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 18,88	R\$ 56,64	0,01 %	3,00	100,00%	R\$ 56,64					
13.27	89726	A	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 6,78	R\$ 54,26	0,01 %	8,00	100,00%	R\$ 54,26					
13.28	89731	A	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 10,33	R\$ 41,31	0,01 %	4,00	100,00%	R\$ 41,31					
13.29	CP0046SB	C	Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	und	27,00	R\$ 11,63	R\$ 313,96	0,05 %	27,00	100,00%	R\$ 313,96					
13.30	89728	A	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	R\$ 9,78	R\$ 264,09	0,04 %	27,00	100,00%	R\$ 264,09					
13.31	89733	A	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 17,04	R\$ 68,17	0,01 %	4,00	100,00%	R\$ 68,17					
13.32	89748	A	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 35,63	R\$ 213,75	0,03 %	6,00	100,00%	R\$ 213,75					

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO
<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
<b>DATA:</b> 24/04/23	
<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

<b>BDI:</b> 14,00%
--------------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23
13.33	CP0047SB	C	Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação).	und	8,00	R\$ 18,42	R\$ 147,38	0,02 %	8,00	100,00%	R\$ 147,38			
13.34	CP0048SB	C	Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação).	und	1,00	R\$ 59,80	R\$ 59,80	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 59,80			
13.35	CP0049SB	C	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	19,00	R\$ 46,55	R\$ 884,38	0,13 %	19,00	100,00%	R\$ 884,38			
13.36	CP0058SB	C	Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada	und	5,00	R\$ 179,72	R\$ 898,61	0,13 %	5,00	100,00%	R\$ 898,61			
<b>Aparelhos sanitários, louças, metais e outros</b>							<b>R\$ 32.078,98</b>		<i>SUBTAPA Aparelhos sanitários, louças, metais e</i> R\$ 32.078,98			<i>SUBTAPA Aparelhos sanitários, louças, metais e</i> R\$ -		
13.37	95547	A	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	R\$ 75,67	R\$ 1.589,14	0,23 %	21,00	100,00%	R\$ 1.589,14			
13.38	CP0060SB	C	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo (fornecimento e instalação).	und	4,00	R\$ 77,39	R\$ 309,58	0,05 %	4,00	100,00%	R\$ 309,58			
13.39	CP0062SB	C	Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação).	und	21,00	R\$ 73,22	R\$ 1.537,67	0,22 %	21,00	100,00%	R\$ 1.537,67			
13.40	CP0063SB	C	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 60cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)	und	4,00	R\$ 196,79	R\$ 787,15	0,11 %	4,00	100,00%	R\$ 787,15			
13.41	CP0064SB	C	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)	und	6,00	R\$ 224,49	R\$ 1.346,93	0,20 %	6,00	100,00%	R\$ 1.346,93			
13.42	86942	A	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E	UN	7,00	R\$ 225,25	R\$ 1.576,77	0,23 %	7,00	100,00%	R\$ 1.576,77			
13.43	CP0068SB	C	Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 30* cm, com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4" x 1.1/2, válvula em	und	2,00	R\$ 279,94	R\$ 559,88	0,08 %	2,00	100,00%	R\$ 559,88			
13.44	CP0070SB	C	Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 cm - com rodapia de 7cm - fornecimento e instalação.	m	28,95	R\$ 484,29	R\$ 14.020,33	2,04 %	28,95	100,00%	R\$ 14.020,33			
13.45	CP0071SB	C	Cuba aço inoxidável (aísi304) de embutir com válvula 3 1/2", de 40,0 x 34,0 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.	und	8,00	R\$ 182,00	R\$ 1.456,01	0,21 %	8,00	100,00%	R\$ 1.456,01			
13.46	86937	A	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 185,61	R\$ 1.113,69	0,16 %	6,00	100,00%	R\$ 1.113,69			
13.47	86927	A	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E	UN	2,00	R\$ 290,06	R\$ 580,12	0,08 %	2,00	100,00%	R\$ 580,12			
13.48	CP0079SB	C	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.	und	6,00	R\$ 85,82	R\$ 514,92	0,08 %	6,00	100,00%	R\$ 514,92			
13.49	86909	A	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" ou 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 116,49	R\$ 931,88	0,14 %	8,00	100,00%	R\$ 931,88			
13.50	CP0081SB	C	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 70,29	R\$ 70,29	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 70,29			
13.51	CP0082SB	C	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e	und	4,00	R\$ 503,33	R\$ 2.013,33	0,29 %	4,00	100,00%	R\$ 2.013,33			
13.52	CP0101SB	C	Expurgo hospitalar e sifão de inox, incluso frete	und	1,00	R\$ 3.671,29	R\$ 3.671,29	0,53 %	1,00	100,00%	R\$ 3.671,29			
<b>Instalações de drenagem pluvial/condicionador de ar</b>							<b>R\$ 4.380,32</b>		<i>SUBTAPA Instalações de drenagem</i> R\$ 4.380,32			<i>SUBTAPA Instalações de drenagem</i> R\$ -		

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO	
	<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
	<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
	<b>DATA:</b> 24/04/23	
	<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
	<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
	<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%	
-------------	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23
13.53	89356	A	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	82,09	R\$ 19,48	R\$ 1.599,33	0,23 %	82,09	100,00%	R\$ 1.599,33			
13.54	89357	A	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,21	R\$ 27,39	R\$ 334,48	0,05 %	12,21	100,00%	R\$ 334,48			
13.55	89395	A	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 11,18	R\$ 33,55	0,00 %	3,00	100,00%	R\$ 33,55			
13.56	89400	A	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 18,25	R\$ 36,50	0,01 %	2,00	100,00%	R\$ 36,50			
13.57	89362	A	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 8,01	R\$ 240,43	0,04 %	30,00	100,00%	R\$ 240,43			
13.58	CP0030SB	A	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 11,24	R\$ 11,24	0,00 %	1,00	100,00%	R\$ 11,24			
13.59	89714	A	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,82	R\$ 51,62	R\$ 1.849,00	0,27 %	35,82	100,00%	R\$ 1.849,00			
13.60	89744	A	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 22,98	R\$ 275,79	0,04 %	12,00	100,00%	R\$ 275,79			
<b>Escavação de vala para passagem de tubulação</b>							<b>R\$ 1.923,31</b>		<b>SUBETAPA Escavação de vala para passagem de tubulação</b>		<b>R\$ 1.923,31</b>	<b>SUBETAPA Escavação de vala para passagem de tubulação</b>		
13.61	93358	A	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	15,30	R\$ 79,59	R\$ 1.217,80	0,18 %	15,30	100,00%	R\$ 1.217,80			
13.62	96995	A	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,62	R\$ 48,26	R\$ 705,51	0,10 %	14,62	100,00%	R\$ 705,51			
<b>14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 89.033,54</b>		<b>ETAPA 14.0 →</b>		<b>R\$ 69.560,34</b>	<b>ETAPA 14.0 → R\$ 11.593,70</b>		
<b>Escavação e reaterro</b>							<b>R\$ 1.344,06</b>		<b>SUBETAPA Escavação e reaterro</b>		<b>R\$ 1.344,06</b>	<b>SUBETAPA Escavação e reaterro R\$ -</b>		
14.1	93358	A	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	8,10	R\$ 79,59	R\$ 644,72	0,09 %	8,10	100,00%	R\$ 644,72			
14.2	93382	A	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	7,93	R\$ 30,93	R\$ 245,26	0,04 %	7,93	100,00%	R\$ 245,26			
14.3	97891	A	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 227,04	R\$ 454,08	0,07 %	2,00	100,00%	R\$ 454,08			
<b>Iluminação</b>							<b>R\$ 8.928,40</b>		<b>SUBETAPA Iluminação</b>		<b>R\$ 6.315,23</b>	<b>R\$ 1.119,93</b>		
14.4	CP0111SB	C	Luminária de LED embutir quadrada de 18W	und	101,00	R\$ 53,33	R\$ 5.386,25	0,78 %	52,00	51,48%	R\$ 2.773,08	21,00	20,79%	R\$ 1.119,93
14.5	CP0127SB	C	Luminária Embutir no Solo PAR 20	und	14,00	R\$ 187,93	R\$ 2.631,01	0,38 %	14,00	100,00%	R\$ 2.631,01			
14.6	CP0112SB	C	Luminária SPOT 5W de embutir no teto	und	5,00	R\$ 38,35	R\$ 191,75	0,03 %	5,00	100,00%	R\$ 191,75			
14.7	97608	A	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 89,92	R\$ 719,39	0,10 %	8,00	100,00%	R\$ 719,39			
<b>Caixa PVC</b>							<b>R\$ 5.252,56</b>		<b>SUBETAPA Caixa PVC</b>		<b>R\$ 3.983,44</b>	<b>R\$ 740,32</b>		

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO
<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
<b>DATA:</b> 24/04/23	
<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%
-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR
14.8	91939	A	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00	R\$ 26,74	R\$ 1.551,18	0,23 %	58,00	100,00%	R\$ 1.551,18
14.9	91940	A	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	R\$ 14,20	R\$ 994,31	0,14 %	22,00	31,45%	R\$ 312,71
14.10	91941	A	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	115,00	R\$ 9,51	R\$ 1.093,37	0,16 %	115,00	100,00%	R\$ 1.093,37
14.11	91936	A	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	116,00	R\$ 12,24	R\$ 1.420,26	0,21 %	68,00	58,63%	R\$ 832,74
14.12	91945	A	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	R\$ 9,21	R\$ 193,44	0,03 %	21,00	100,00%	R\$ 193,44
<b>Tomadas e interruptores</b>							<b>R\$ 6.320,27</b>		<b>SUBETAPA Tomadas e interruptores</b>		<b>R\$ 3.893,61</b>
14.13	91992	A	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	R\$ 38,45	R\$ 1.038,21	0,15 %	27,00	100,00%	R\$ 1.038,21
14.14	91996	A	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	R\$ 29,79	R\$ 923,43	0,13 %	-17,00	-54,85%	R\$ (506,49)
14.15	92000	A	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	115,00	R\$ 26,43	R\$ 3.038,90	0,44 %	115,00	100,00%	R\$ 3.038,90
14.16	92023	A	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 44,29	R\$ 132,87	0,02 %	-7,00	-233,33%	R\$ (310,03)
14.17	92027	A	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 58,85	R\$ 58,85	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 58,85
14.18	91953	A	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00	0,08 %	21,00	100,00%	R\$ 525,00
14.19	91959	A	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	R\$ 39,56	R\$ 435,14	0,06 %	-3,00	-27,28%	R\$ (118,70)
14.20	91967	A	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 54,10	R\$ 54,10	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 54,10
14.21	91955	A	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 30,94	R\$ 61,88	0,01 %	2,00	100,00%	R\$ 61,88
14.22	83399	A	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 25,95	R\$ 51,89	0,01 %	2,00	100,00%	R\$ 51,89
<b>Condutores</b>							<b>R\$ 34.356,92</b>		<b>SUBETAPA Condutores</b>		<b>R\$ 31.520,52</b>
14.23	91926	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.100,00	R\$ 3,86	R\$ 15.844,86	2,31 %	3.820,00	93,18%	R\$ 14.764,06
14.24	91928	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00	R\$ 6,27	R\$ 8.778,00	1,28 %	1.120,00	80,00%	R\$ 7.022,40
14.25	91930	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 8,58	R\$ 858,42	0,13 %	100,00	100,00%	R\$ 858,42
14.26	92980	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	R\$ 10,36	R\$ 2.279,77	0,33 %	220,00	100,00%	R\$ 2.279,77
14.27	92982	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	R\$ 15,86	R\$ 79,29	0,01 %	5,00	100,00%	R\$ 79,29

PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		
01/05/23	A	16/07/23
2ª MEDIÇÃO		
QUANT.	%	VALOR
-	-	-
28,00	39,99%	R\$ 397,60
28,00	24,13%	R\$ 342,72
-	-	-
		R\$ 1.421,07
28,00	90,33%	R\$ 834,12
7,00	233,33%	R\$ 310,03
7,00	63,64%	R\$ 276,92
		R\$ 1.823,40
180,00	4,39%	R\$ 694,80
180,00	12,86%	R\$ 1.128,60
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -

	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO
<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
<b>DATA:</b> 24/04/23	
<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

<b>BDI:</b> 14,00%
--------------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23
14.28	92984	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R\$ 25,90	R\$ 259,01	0,04 %	10,00	100,00%	R\$ 259,01			
14.29	92986	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$ 35,00	R\$ 874,95	0,13 %	25,00	100,00%	R\$ 874,95			
14.30	92990	A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R\$ 67,28	R\$ 5.382,62	0,78 %	80,00	100,00%	R\$ 5.382,62			
<b>Proteção de equipamento</b>							<b>R\$ 6.426,53</b>		<i>SUBETAPA Proteção de equipamento</i> R\$ 4.942,64			R\$ 811,99		
14.31	93655	A	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00	R\$ 13,24	R\$ 476,47	0,07 %	27,00	74,99%	R\$ 357,31	7,00	19,45%	R\$ 92,68
14.32	93656	A	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 13,24	R\$ 79,41	0,01 %	-7,00	-116,75%	R\$ (92,71)	7,00	116,71%	R\$ 92,68
14.33	93663	A	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	R\$ 60,65	R\$ 1.637,50	0,24 %	14,00	51,85%	R\$ 849,05	7,00	25,93%	R\$ 424,55
14.34	93664	A	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 63,33	R\$ 126,65	0,02 %	2,00	100,00%	R\$ 126,65			R\$ -
14.35	93672	A	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 86,98	R\$ 347,93	0,05 %	4,00	100,00%	R\$ 347,93			R\$ -
14.36	74130/005	A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 130,56	R\$ 261,13	0,04 %	0,00	0,00%	R\$ 0,01	1,00	50,00%	R\$ 130,56
14.37	74130/006	A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 369,11	R\$ 738,22	0,11 %	2,00	100,00%	R\$ 738,22			R\$ -
14.38	CP01405B	C	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 ma	und	9,00	R\$ 163,84	R\$ 1.474,57	0,21 %	9,00	100,00%	R\$ 1.474,57			R\$ -
14.39	CP01415B	C	DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v (vn=220v) e 150v (vn=127v), corr. max.19,5ka	und	16,00	R\$ 71,52	R\$ 1.144,38	0,17 %	14,00	87,50%	R\$ 1.001,34	1,00	6,25%	R\$ 71,52
14.40	96985	A	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 70,13	R\$ 140,27	0,02 %	2,00	100,00%	R\$ 140,27			R\$ -
<b>Eletrodutos e tubos</b>							<b>R\$ 15.868,96</b>		<i>SUBETAPA Eletrodutos e tubos</i> R\$ 10.960,76			R\$ 3.080,04		
14.41	91863	A	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	R\$ 10,97	R\$ 6.580,08	0,96 %	410,00	68,32%	R\$ 4.495,78	120,00	20,01%	R\$ 1.316,40
14.42	91871	A	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	R\$ 11,55	R\$ 4.619,28	0,67 %	210,00	52,49%	R\$ 2.424,78	120,00	30,00%	R\$ 1.386,00
14.43	93009	A	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 20,98	R\$ 2.097,60	0,31 %	70,00	69,99%	R\$ 1.468,20	18,00	18,00%	R\$ 377,64
14.44	93010	A	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 29,05	R\$ 580,94	0,08 %	20,00	100,00%	R\$ 580,94			R\$ -
14.45	CP01435B	C	Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões	und	18,00	R\$ 110,61	R\$ 1.991,06	0,29 %	18,00	100,00%	R\$ 1.991,06			R\$ -
<b>Quadros</b>							<b>R\$ 5.489,90</b>		<i>SUBETAPA Quadros</i> R\$ 3.316,70			R\$ 1.086,60		
14.46	74131/006	A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	UN	3,00	R\$ 1.086,60	R\$ 3.259,81	0,47 %	1,00	33,33%	R\$ 1.086,61	1,00	33,33%	R\$ 1.086,60

**OBJETO:** REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO  
**ENDEREÇO:** R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO  
**LOCAL:** PORTO VELHO - RO  
**DATA:** 24/04/23  
**ÚLT. ATUAL:**  
**AUTOR:** ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO  
**BANCOS DE DADOS:** SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA  
**ENCARGOS SOCIAIS:** SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%

**TOMADA DE PREÇO 016/2022**  
**DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022**  
**HORÁRIO: 09:00:00**

BDI: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR
14.47	74131/008	A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 2.230,09	R\$ 2.230,09	0,32 %	1,00	100,00%	R\$ 2.230,09
<b>Diversos</b>							<b>R\$ 1.968,32</b>		<b>SUBETAPA Diversos R\$ 1.181,00</b>		<b>R\$ 787,32</b>
14.48	CP0168SB	C	Exaustor de teto	und	10,00	R\$ 196,83	R\$ 1.968,32	0,29 %	6,00	60,00%	R\$ 1.181,00
<b>Demolição e retirada</b>							<b>R\$ 3.077,62</b>		<b>SUBETAPA Demolição e retirada R\$ 2.102,38</b>		<b>R\$ 723,03</b>
14.49	97665	A	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	44,00	R\$ 1,19	R\$ 52,17	0,01 %	30,00	68,07%	R\$ 35,51
14.50	97661	A	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	400,00	R\$ 0,62	R\$ 246,24	0,04 %	258,00	64,25%	R\$ 158,20
14.51	97660	A	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	80,00	R\$ 0,62	R\$ 49,25	0,01 %	61,00	76,08%	R\$ 37,47
14.52	CP0172SB	C	Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores	und	3,00	R\$ 92,23	R\$ 276,68	0,04 %	1,00	33,33%	R\$ 92,22
14.53	CP0174SB	C	Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).	m	400,00	R\$ 6,13	R\$ 2.453,28	0,36 %	290,00	72,51%	R\$ 1.778,98
<b>15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>							<b>R\$ 18.140,23</b>		<b>ETAPA 15.0 → R\$ 15.099,98</b>		<b>R\$ 3.040,25</b>
<b>Acessório cabeamento - Metálico</b>							<b>R\$ 7.806,44</b>		<b>SUBETAPA Acessório cabeamento - Metálico R\$ 4.873,70</b>		<b>R\$ 2.932,74</b>
15.1	CP0271SB	C	Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic	und	2,00	R\$ 1.914,47	R\$ 3.828,94	0,56 %	1,00	50,00%	R\$ 1.914,47
15.2	98302	A	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 712,12	R\$ 1.424,25	0,21 %	1,00	50,00%	R\$ 712,13
15.3	CP0273SB	C	Bloco de engate rápido M10B Bargoa e acessórios	und	1,00	R\$ 211,12	R\$ 211,12	0,03 %	0,00	0,00%	R\$ -
15.4	CP0274SB	C	Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568b	und	35,00	R\$ 29,38	R\$ 1.028,22	0,15 %	34,00	97,14%	R\$ 998,84
15.5	CP0287SB	C	Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b	und	35,00	R\$ 9,43	R\$ 329,97	0,05 %	34,00	97,14%	R\$ 320,54
15.6	CP0181SB	C	Patch cord cat.6 1,5m azul	und	19,00	R\$ 28,11	R\$ 534,14	0,08 %	18,00	94,74%	R\$ 506,03
15.7	CP0276SB	C	Patch cord cat.6 1,5m cinza	und	16,00	R\$ 28,11	R\$ 449,80	0,07 %	15,00	93,75%	R\$ 421,69
<b>Acessório cabeamento - Rack</b>							<b>R\$ 638,31</b>		<b>SUBETAPA Acessório cabeamento - Rack R\$ 638,31</b>		<b>R\$ -</b>
15.8	CP0184SB	C	Guia "de cabo horizontal fechado 1u 19" preto	und	1,00	R\$ 38,34	R\$ 38,34	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 38,34
15.9	CP0185SB	C	Painel de fechamento 19" 1 U preto	und	1,00	R\$ 9,17	R\$ 9,17	0,00 %	1,00	100,00%	R\$ 9,17
15.10	CP0186SB	C	Bandeja fixação simples 400mm	und	1,00	R\$ 120,35	R\$ 120,35	0,02 %	1,00	100,00%	R\$ 120,35

PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		
01/05/23	A	16/07/23
2ª MEDIÇÃO		
QUANT.	%	VALOR
	0,00%	R\$ -
		R\$ 787,32
4,00	40,00%	R\$ 787,32
		R\$ 723,03
8,00	18,25%	R\$ 9,52
120,00	30,21%	R\$ 74,40
12,00	15,11%	R\$ 7,44
1,00	33,33%	R\$ 92,23
88,00	21,99%	R\$ 539,44
		R\$ 3.040,25
		R\$ 2.932,74
1,00	50,00%	R\$ 1.914,47
1,00	50,00%	R\$ 712,12
1,00	100,00%	R\$ 211,12
1,00	2,86%	R\$ 29,38
1,00	2,86%	R\$ 9,43
1,00	5,26%	R\$ 28,11
1,00	6,25%	R\$ 28,11
		R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -



	<b>OBJETO:</b> REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO	
	<b>ENDEREÇO:</b> R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO	
	<b>LOCAL:</b> PORTO VELHO - RO	
	<b>DATA:</b> 24/04/23	
	<b>ÚLT. ATUAL:</b>	
	<b>AUTOR:</b> ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO	<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>
	<b>BANCOS DE DADOS:</b> SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA	<b>DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b> SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%	<b>HORÁRIO: 09:00:00</b>

BDI: 14,00%
-------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%	VALOR	01/05/23	A	16/07/23
15.27	CP0200SB	C	Certificação dos cabos de rede	und	35,00	R\$ 50,97	R\$ 1.783,93	0,26 %	35,00	100,00%	R\$ 1.783,93			
<b>Demolição e retirada</b>							<b>R\$ 306,66</b>		<i>SUBETAPA Demolição e retirada</i> R\$ 306,66			<i>SUBETAPA Demolição e retirada</i> R\$ -		
15.28	CP0174SB	C	Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).	m	50,00	R\$ 6,13	R\$ 306,66	0,04 %	50,00	100,00%	R\$ 306,66			
<b>16.0 INCÊNDIO</b>							<b>R\$ 2.277,43</b>		<i>ETAPA 16.0 →</i> R\$ 2.277,43			<i>ETAPA 16.0 →</i> R\$ -		
16.1	CP0201SB	C	Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.	und	3,00	R\$ 258,51	R\$ 775,52	0,11 %	3,00	100,00%	R\$ 775,52			
16.2	97599	C	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00	R\$ 29,77	R\$ 714,37	0,10 %	24,00	100,00%	R\$ 714,37			
16.3	CP0202SB	C	Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m)	und	3,00	R\$ 35,29	R\$ 105,88	0,02 %	3,00	100,00%	R\$ 105,88			
16.4	CP0205SB	C	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	4,00	R\$ 53,84	R\$ 215,37	0,03 %	4,00	100,00%	R\$ 215,37			
16.5	CP0207SB	C	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	7,00	R\$ 51,47	R\$ 360,30	0,05 %	7,00	100,00%	R\$ 360,30			
16.6	CP0208SB	C	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	3,00	R\$ 35,33	R\$ 105,99	0,02 %	3,00	100,00%	R\$ 105,99			
<b>17.0 CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA</b>							<b>R\$ 1.311,15</b>		<i>ETAPA 17.0 →</i> R\$ 1.311,15			<i>ETAPA 17.0 →</i> R\$ -		
17.1	CP0438SB	C	Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura metálica, incluso porta em alambrado 50x50m (Pav. Térreo)	und	1,00	R\$ 860,78	R\$ 860,78	0,13 %	1,00	100,00%	R\$ 860,78			
17.2	92687	A	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,52	R\$ 29,91	R\$ 314,69	0,05 %	10,52	100,00%	R\$ 314,69			
17.3	92699	A	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 17,04	R\$ 68,17	0,01 %	4,00	100,00%	R\$ 68,17			
17.4	95248	C	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 67,51	R\$ 67,51	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 67,51			
<b>18.0 DIVERSOS</b>							<b>R\$ 3.840,62</b>		<i>ETAPA 18.0 →</i> R\$ 3.840,62			<i>ETAPA 18.0 →</i> R\$ -		
18.1	CP0319SB	C	Limpeza final da obra	m²	605,15	R\$ 3,09	R\$ 1.869,55	0,27 %	605,15	100,00%	R\$ 1.869,55			
18.2	CP0627SB	C	Placa de inauguração em alumínio 0,40 x 0,60m fornecimento e colocação	und	1,00	R\$ 723,92	R\$ 723,92	0,11 %	1,00	100,00%	R\$ 723,92			
18.3	CP0409SB	C	Placa de sinalização e identificação de ambiente em braille	und	2,00	R\$ 79,83	R\$ 159,67	0,02 %	2,00	100,00%	R\$ 159,67			
18.4	98504	C	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	16,57	R\$ 13,82	R\$ 228,94	0,03 %	16,57	100,00%	R\$ 228,94			
18.5	CP0353SB	C	Plantio de Orquídea de Bambu Altura de 0,50m á 0,70m	und	20,00	R\$ 34,58	R\$ 691,60	0,10 %	20,00	100,00%	R\$ 691,60			
18.6	99814	C	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	92,68	R\$ 1,80	R\$ 166,94	0,02 %	92,68	100,00%	R\$ 166,94			

**OBJETO:** REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO  
**ENDEREÇO:** R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO  
**LOCAL:** PORTO VELHO - RO  
**DATA:** 24/04/23  
**ÚLT. ATUAL:**  
**AUTOR:** ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO  
**BANCOS DE DADOS:** SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA  
**ENCARGOS SOCIAIS:** SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%

**TOMADA DE PREÇO 016/2022**  
**DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022**  
**HORÁRIO: 09:00:00**

BDI: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
						TOTAL SEM BDI R\$	602.105,29
						TOTAL DO BDI 14,00% R\$	84.294,74
						<b>VALOR FINAL DA PROPOSTA → R\$</b>	<b>686.400,03</b>

PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)		
QUANT.	%	VALOR
SALDO TOTAL:		85,07% R\$ 583.913,40
TOTAL MEDIDO:		14,93% R\$ 102.486,63

PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		
01/05/23	A	16/07/23
<b>2ª MEDIÇÃO</b>		
QUANT.	%	VALOR
TOTAL 2ª MED.:	7,53%	R\$ 51.652,58
EM ELABORAÇÃO		

RESUMO DE PAGAMENTOS DAS MEDIÇÕES		
1ª MEDIÇÃO	7,41%	R\$ 50.834,05
2ª MEDIÇÃO	7,53%	R\$ 51.652,58
3ª MEDIÇÃO	-	-
4ª MEDIÇÃO	-	-
5ª MEDIÇÃO	-	-
6ª MEDIÇÃO	-	-
7ª MEDIÇÃO	-	-
8ª MEDIÇÃO	-	-
9ª MEDIÇÃO	-	-
10ª MEDIÇÃO	-	-
11ª MEDIÇÃO	-	-
12ª MEDIÇÃO	-	-

INVESTIGADORA ENGENHEIRA E REPRESENTAÇÃO Nº174  
 STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 RN Nº 041983654-0 CREA-AM

  
 ERONILDO GOMES DOS SANTOS  
 ENGENHEIRO CIVIL - 1664 D/RO  
 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - SEMESC

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM**

**Objeto: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião**

A empresa **INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA**, firma estabelecida nesta cidade, sito Rua Pixinguinha nº 61, Bairro Pedrinhas – CEP 76.801-448 em Porto Velho – RO, com Inscrição no CNPJ nº 30.106.351/0001-42, vem mui respeitosamente mostrar as fotos dos serviços executados do **CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM** das obras e serviços de engenharia para **Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião**.

1. Localização:

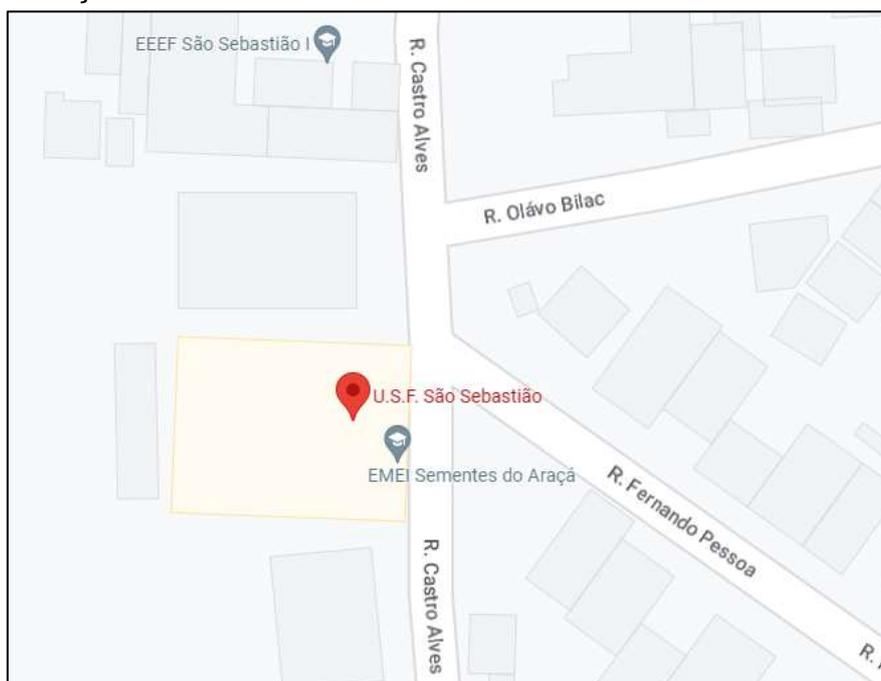


Figura 1 MAPS USF SÃO SEBASTIÃO

**2. FOTOS DE EXECUÇÃO:  
2ª MEDIÇÃO***Figura 2**Figura 3**Figura 4**Figura 5*



Figura 6



Figura 8



Figura 7



Figura 9

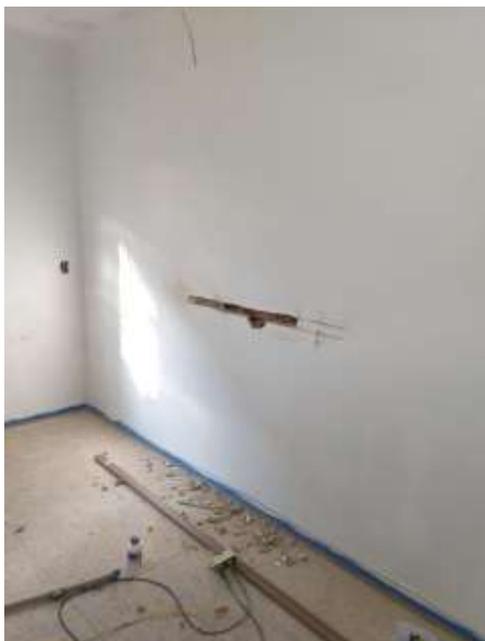


Figura 10



Figura 12



Figura 11



Figura 13



Figura 14



Figura 16



Figura 15



Figura 17



Figura 18



Figura 20

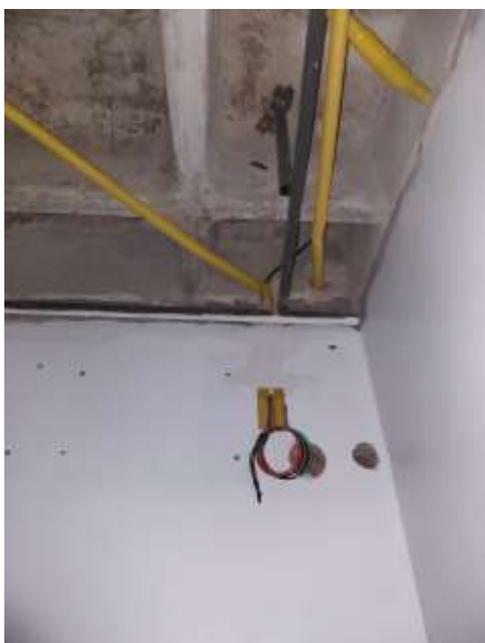


Figura 19



Figura 21



Figura 22



Figura 24

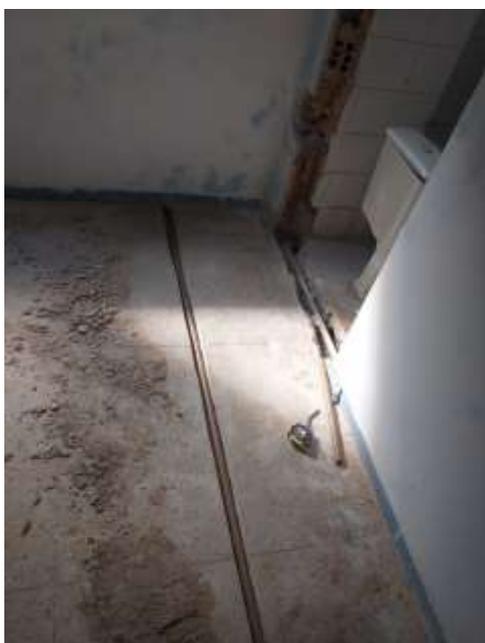


Figura 23



Figura 25

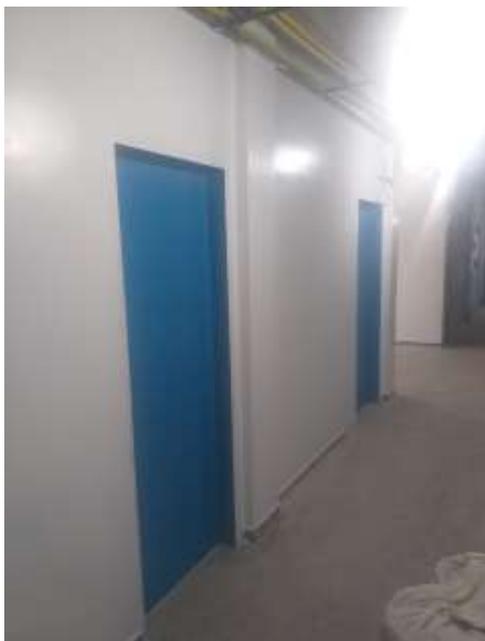


Figura 26



Figura 28



Figura 27



Figura 29



Figura 30



Figura 32



Figura 31

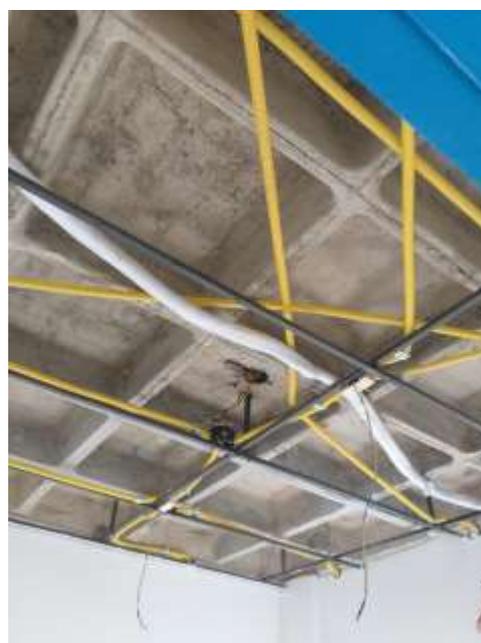


Figura 33

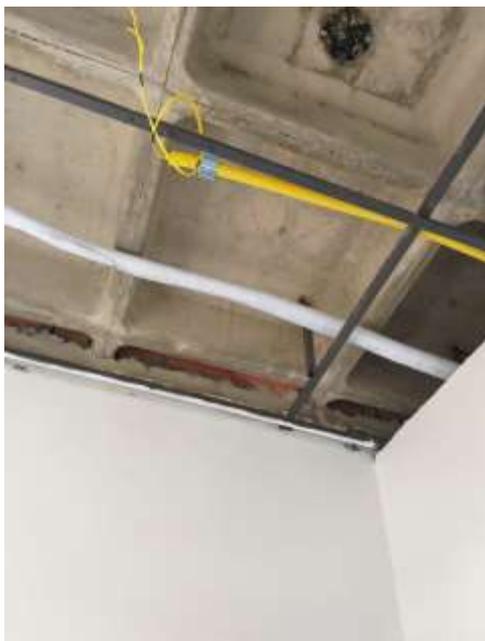


Figura 34



Figura 36



Figura 35



Figura 37



Figura 38



Figura 40



Figura 39



Figura 41



Figura 42



Figura 44



Figura 43



Figura 45



Figura 46



Figura 48



Figura 47



Figura 49



Figura 50



Figura 52



Figura 51



Figura 53



Figura 54



Figura 56



Figura 55



Figura 57



Figura 58



Figura 60



Figura 59



Figura 61



Figura 62



Figura 64



Figura 63

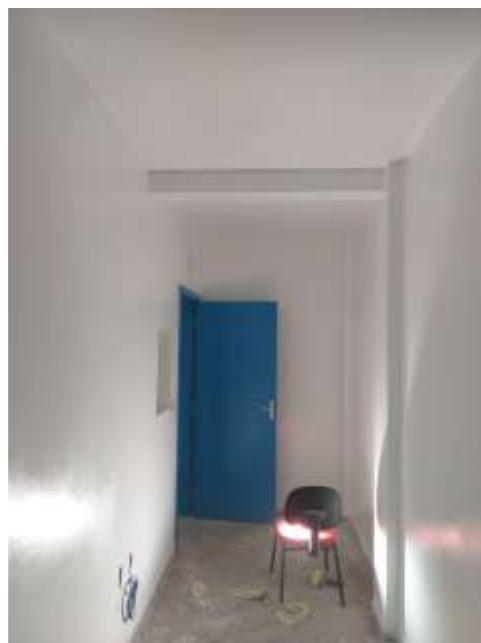


Figura 65

*Figura 66**Figura 68**Figura 67**Figura 69*



Figura 70



Figura 72



Figura 71



Figura 73



Figura 74



Figura 76



Figura 75



Figura 77

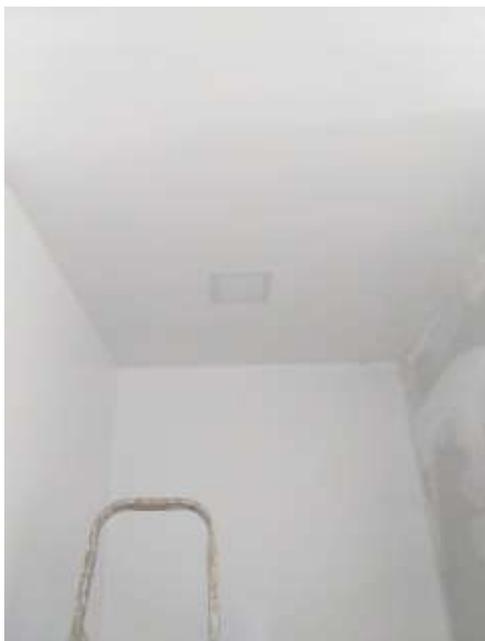


Figura 78



Figura 80

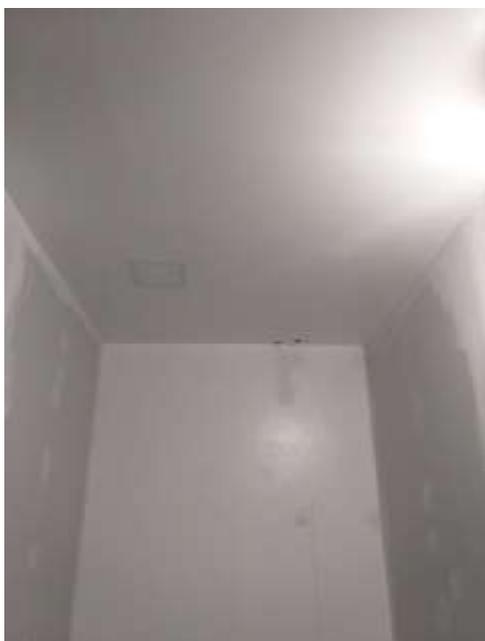


Figura 79




Figura 81



Figura 82

PORTO VELHO, RO 14 DE JULHO DE 2023

  
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
STEPHANO LIMA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN Nº 041903054-0 CREA-AM

 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA					 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTITUÍDO EM 1988			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA								
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos										
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		01/05/2023		130		1		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	210	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
21/06/2023		159	51	210						
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente		1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro		1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro			Mestre de Obras							
Eletricista			Apontador							
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
Total		2,00	Total	2,00			-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<p><b>Serviço de retirada das bancadas e utensílios nas salas</b></p>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM										

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>							
		<b>OBJETO:</b>	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC 		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022	Dia: 02/05/2023	FOLHA: 130	LIVRO: 1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023	DIAS COR.: 160 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 50	Prazo Contrato: 210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	terça-feira, 2 de maio de 2023		
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artifice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>Serviço de retirada das bancadas e utensilios nas salas</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM				<hr/>					

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>							
		<b>OBJETO:</b>	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC 		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022	Dia: 03/05/2023	FOLHA: 130	LIVRO: 1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023	DIAS COR.: 161	DIAS REST.: 49	Prazo Contrato: 210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV			
<b>DIA DA SEMANA :</b>		quarta-feira, 3 de maio de 2023							
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>			-	<b>Total</b>		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<p><b>Serviço de Pintura do do forro da clinica 01</b></p>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>							
		<b>OBJETO:</b>	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC 		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022	Dia: 04/05/2023	FOLHA: 130	LIVRO: 1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023	DIAS COR.: 162	DIAS REST.: 48	Prazo Contrato: 210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV			
<b>DIA DA SEMANA :</b>		quinta-feira, 4 de maio de 2023							
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>		<b>-</b>	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<p><b>Serviço de Pintura do do forro da clinica 01</b></p>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM									

 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>				 MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONSTRUÇÃO DO FUTURO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022			
		Fiscal do Contrato:							PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 05/05/2023		FOLHA: 130	LIVRO: 1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 163	DIAS REST.: 47	Prazo Contrato: 210	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 5 de maio de 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>			-	<b>Total</b>		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
<p><b>Serviço de Pintura do do forro da clinica 01</b></p>									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>									
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>									
<b>OBJETO:</b> Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		<b>CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM</b> <b>Ordem de Serviço n° 019/2022</b>									
Órgão Fiscalizador: SEMESC 		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022				
<b>INÍCIO CONTRATUAL</b> 23/11/2022		Dia: 06/05/2023		FOLHA: 130		LIVRO: 1		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
<b>TÉRMINO CONTRATUAL</b> 21/06/2023		DIAS COR.: 164		DIAS REST.: 46		Prazo Contrato: 210		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	
		DIA DA SEMANA :		sábado, 6 de maio de 2023							
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		
Servente			Engenheiro Residente								
Pedreiro			Encarregado								
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista			Apontador								
Bombeiro Hidraulico											
Artífice											
<b>Total</b>		-	<b>Total</b>		-				-	<b>Total</b>	
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>											
<b>SÁBADO, SEM EXPEDIENTE</b>											
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>											
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>											
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM											

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>									
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		<b>OBJETO:</b>		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
Orgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022		PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 07/05/2023		FOLHA: 130	LIVRO: 1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 165	DIAS REST.: 45	Prazo Contrato: 210		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV			
		DIA DA SEMANA :		domingo, 7 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente			Engenheiro Residente								
Pedreiro			Encarregado								
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista			Apontador								
Bombeiro Hidraulico											
Artífice											
<b>Total</b>		-	<b>Total</b>		-		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>											
<b>DOMINGO, SEM EXPEDIENTE</b>											
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>											
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>											
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM											

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>									
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		<b>OBJETO:</b>		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022		PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
 Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 08/05/2023		FOLHA: 130	LIVRO: 1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 166	DIAS REST.: 44	Prazo Contrato: 210		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 8 de maio de 2023							
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00						
Pedreiro		1,00	Encarregado		1,00						
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista		1,00	Apontador								
Bombeiro Hidraulico											
Artífice											
<b>Total</b>		<b>3,00</b>	<b>Total</b>		<b>2,00</b>		<b>-</b>	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>											
<p><b>Execução de passagemde fiação elétrica + chumbagem das caixinhas</b></p>											
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>											
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>											
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM											

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>								
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022				
 Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022	Dia:	09/05/2023		FOLHA:	130	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023	DIAS COR.:	167	DIAS REST.:	43	Prazo Contrato:	210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	
DIA DA SEMANA :		terça-feira, 9 de maio de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00							
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00							
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista	1,00	Apontador								
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>		-	<b>Total</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>										
<p><b>Execução de passagemde fiação elétrica + chumbagem das caixinhas</b></p>										
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>										
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>										
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM					<hr style="width: 100%;"/>					

 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA					 CONSTRUINDO O PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA								
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos										
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		10/05/2023		130		1		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
21/06/2023		168		42		210		<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 10 de maio de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00					
Pedreiro		1,00	Encarregado		1,00					
Carpinteiro			Mestre de Obras							
Eletricista		1,00	Apontador							
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
Total		3,00	Total		2,00		-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<p><b>Execução de passagemde fiação elétrica + chumbagem das caixinhas</b></p>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM										

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
23/11/2022	11/05/2023	130	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
21/06/2023	169	41	210	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV			
DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 11 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artifice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>Limpeza e organização da área</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 CONSTRUINDO O PROGRESSO		
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022							
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 12/05/2023		FOLHA: 130	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 170	DIAS REST.: 40	Prazo Contrato: 210		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 12 de maio de 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>			-	<b>Total</b>		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
<h3 style="margin: 0;">Limpeza e organização da área</h3>									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM					<hr style="width: 100%;"/>				

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>								
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
<b>SEMESC</b> Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM	Ordem de Serviço n° 019/2022							
Órgão Fiscalizador:	SEMESC	Fiscal do Contrato:						<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA								
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>				
23/11/2022	13/05/2023	130		1		MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:		Prazo Contrato:		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
21/06/2023	171	39		210		<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA : sábado, 13 de maio de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		Engenheiro Residente								
Pedreiro		Encarregado								
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<b>SÁBADO, SEM EXPEDIENTE</b>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM										

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 Prefeitura Porto Velho			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 14/05/2023		FOLHA: 130	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 172	DIAS REST.: 38	Prazo Contrato: 210	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV					
		DIA DA SEMANA :		domingo, 14 de maio de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		Engenheiro Residente								
Pedreiro		Encarregado								
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<h2 style="font-size: 24px;">DOMINGO, SEM EXPEDIENTE</h2>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM										

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>						 PORTO VELHO CONSTRUINDO O PROGRESSO		
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 15/05/2023		FOLHA: 130		LIVRO: 1		CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 173		DIAS REST.: 37		Prazo Contrato: 210		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV
		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 15 de maio de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00					
Pedreiro		1,00	Encarregado		1,00					
Carpinteiro			Mestre de Obras							
Eletricista		1,00	Apontador							
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>		<b>3,00</b>	<b>Total</b>		<b>2,00</b>		-	<b>Total</b>		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<h3>Recorte e perfuração de parede para passagem de fiação elétrica no laboratório</h3>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM					<hr style="width: 100%;"/>					

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO					
23/11/2022	16/05/2023	130	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
21/06/2023	174	36	210	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV			
DIA DA SEMANA :		terça-feira, 16 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista	1,00	Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<p><b>Recorte e perfuração de parede para passagem de fiação elétrica no laboratório</b></p>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 <p>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM</p>									

 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA						 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO		
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 17/05/2023		FOLHA: 130		LIVRO: 1		CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 175		DIAS REST.: 35		Prazo Contrato: 210		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 17 de maio de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00							
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista	1,00	Apontador								
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>			-	<b>Total</b>			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<p><b>Recorte e perfuração de parede para passagem de fiação elétrica no laboratório</b></p>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM										

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 PREFEITURA <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 18/05/2023		FOLHA: 130	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 176	DIAS REST.: 34	Prazo Contrato: 210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 18 de maio de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00							
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00							
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00							
Artífice										
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>			-	<b>Total</b>			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Fechamento de vão do laboratório, Pintura e restauração do consultório</p>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM					<hr style="width: 100%;"/>					

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 19/05/2023		FOLHA: 130	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 177	DIAS REST.: 33	Prazo Contrato: 210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV					
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 19 de maio de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00							
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00							
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00							
Artífice										
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>		-	<b>Total</b>				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Fechamento de vão do laboratório, Pintura e restauração do consultório</p>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM										


		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO					
23/11/2022	20/05/2023	130	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
21/06/2023	178	32	210	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV			
DIA DA SEMANA :		sábado, 20 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente		Engenheiro Residente							
Pedreiro		Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>SÁBADO, SEM EXPEDIENTE</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b> INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022				
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Contrato: Nº 16/2022/COJUSA/PGM      Ordem de Serviço nº 019/2022 Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022	Dia: 21/05/2023	FOLHA: 130	LIVRO: 1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					<input type="checkbox"/> MANHÃ	<input type="checkbox"/> TARDE	<input type="checkbox"/> NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023	DIAS COR.: 179	DIAS REST.: 31	Prazo Contrato: 210	domingo, 21 de maio de 2023					<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					
Servente		Engenheiro Residente									
Pedreiro		Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico											
Artífice											
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>											
<b>DOMINGO, SEM EXPEDIENTE</b>											
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>											
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>											
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM					<hr/>						

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
23/11/2022	22/05/2023	130		1		MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:		Prazo Contrato:		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
21/06/2023	180	30		210		<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	
DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 22 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>		<b>-</b>	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>Pintura do forro, retirada de bancadas e fechamento do vão da porta da área do laboratório</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>							
		<b>OBJETO:</b>	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO					
23/11/2022	23/05/2023	130	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
21/06/2023	181	29	210	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV			
<b>DIA DA SEMANA :</b>		terça-feira, 23 de maio de 2023							
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>Pintura do forro, retirada de bancadas e fechamento do vão da porta da área do laboratório</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022			
 Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO					
23/11/2022	24/05/2023	130	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
21/06/2023	182	28	210	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV			
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 24 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>Pintura do forro, retirada de bancadas e fechamento do vão da porta da área do laboratório</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 CONSTRUINDO O FUTURO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA								
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos										
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		25/05/2023		130		1		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
21/06/2023		183	27	210		<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente		1,00	Engenheiro Residente	1,00	EQUIPAMENTOS					
Pedreiro		1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro			Mestre de Obras							
Eletricista			Apontador							
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
Total		2,00	Total	2,00			-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<h3 style="margin: 0;">Execução de Chapisco e Reboco nos consultórios</h3>										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM					_____					

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022			
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
23/11/2022	26/05/2023	130	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	
21/06/2023	184	26	210	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV			
DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 26 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado	1,00						
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>Execução de Chapisco e Reboco nos consultórios</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO					
23/11/2022	27/05/2023	130	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM			
21/06/2023	185	25	210	<input checked="" type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV			
DIA DA SEMANA :		sábado, 27 de maio de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente		Engenheiro Residente							
Pedreiro		Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
<b>SÁBADO, SEM EXPEDIENTE</b>									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>											
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>											
<b>SEMESC</b> Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		<b>OBJETO:</b> Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		<b>CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM</b>		<b>Ordem de Serviço n° 019/2022</b>							
		Fisco do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA		<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022									
<b>INÍCIO CONTRATUAL</b> 23/11/2022		Dia: 28/05/2023		FOLHA: <b>130</b>		LIVRO: <b>1</b>		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
<b>TÉRMINO CONTRATUAL</b> 21/06/2023		DIAS COR.: <b>186</b>		DIAS REST.: <b>24</b>		Prazo Contrato: <b>210</b>		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV			
		<b>DIA DA SEMANA :</b>		domingo, 28 de maio de 2023									
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		<b>QUANT.</b>		<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>		<b>QUANT.</b>		<b>QUANT.</b>			<b>DESCRIÇÃO</b>		
Servente				Engenheiro Residente				<b>EQUIPAMENTOS</b>					
Pedreiro				Encarregado									
Carpinteiro				Mestre de Obras									
Eletricista				Apontador									
Bombeiro Hidraulico													
Artífice													
<b>Total</b>		-		<b>Total</b>		-					<b>Total</b>		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>													
<b>DOMINGO, SEM EXPEDIENTE</b>													
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>													
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>													
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>							
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM													











 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 PREFEITURA <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO O FUTURO					
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022					
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022										
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos												
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		04/06/2023								MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		210		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
21/06/2023		193		17						<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
		DIA DA SEMANA :		domingo, 4 de junho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO						
Servente		Engenheiro Residente										
Pedreiro		Encarregado										
Carpinteiro		Mestre de Obras										
Eletricista		Apontador										
Bombeiro Hidraulico												
Artífice												
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:												
Não houve expediente												
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO												
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO												
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM												



		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022							
Órgão Fiscalizador: SEMESC 		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022	Dia: 06/06/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023	DIAS COR.: 195	DIAS REST.: 15	Prazo Contrato:	210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
DIA DA SEMANA :		terça-feira, 6 de junho de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
Reboco e acabamento nas passagens de conduite									
Remoção de portais									
Fechamento provisório em pvc de vão aberto									
Limpeza da obra									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM									


		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>								
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC 		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022	Dia: 07/06/2023	FOLHA:	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023	DIAS COR.: 196	DIAS REST.: 14	Prazo Contrato:	210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV			
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 7 de junho de 2023								
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00							
Pedreiro	1,00	Encarregado								
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>			-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>										
Aplicação de selador e massa corrida no laboratório										
Montagem e instalação de portais										
Remoção de placas de compensado do corredor										
Limpeza da obra										
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>										
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>										
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM										

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022					
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião										
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022										
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos												
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		08/06/2023								MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:	197	DIAS REST.:	13	Prazo Contrato:	210	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
21/06/2023								<input checked="" type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 8 de junho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		2,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro		1,00	Encarregado									
Carpinteiro			Mestre de Obras									
Eletricista			Apontador									
Bombeiro Hidraulico												
Artífice												
Total		3,00	Total		1,00			-	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:												
Aplicação de tinta no laboratório												
Raspagem/limpeza dos granilites												
aplicação de fita nos granilites												
Limpeza da obra												
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO												
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO												
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM						<hr/>						





 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 PREFEITURA PORTOVELHO CONSTRUINDO O PROGRESSO						
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA											
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022						
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022											
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022						
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA											
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO			
23/11/2022		11/06/2023								MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		210		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
21/06/2023		200		10						<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	
		DIA DA SEMANA :		domingo, 11 de junho de 2023									
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO						
Servente		Engenheiro Residente											
Pedreiro		Encarregado											
Carpinteiro		Mestre de Obras											
Eletricista		Apontador											
Bombeiro Hidraulico													
Artifice													
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:													
Não houve expediente													
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO													
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO													
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO							
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM													

 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>				 PREFEITURA <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO PROGRESSO							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA											
OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022		PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022							
Órgão Fiscalizador: SEMESC   Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA											
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 12/06/2023		FOLHA:		LIVRO:		1		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 201		DIAS REST.: 9		Prazo Contrato: 210		<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUV		<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUV		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	
		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 12 de junho de 2023									
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO							
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00		1,00	Martelete							
Pedreiro	1,00	Encarregado			1,00	Serra circular							
Carpinteiro		Mestre de Obras											
Eletricista		Apontador											
Bombeiro Hidraulico		Gesseiro	1,00										
Artífice													
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>Total</b>							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:													
Aparelhamento em alvenaria													
Remoção de portais													
Remoção de janelas													
Montagem de portais													
Instalação de forro em Drywall no laboratório													
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO													
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO													
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO							
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM													



		DIÁRIO DE OBRA							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022							
Órgão Fiscalizador: SEMESC  		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA							
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 14/06/2023		FOLHA:	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL 21/06/2023		DIAS COR.: 203	DIAS REST.: 7	Prazo Contrato: 210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 14 de junho de 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS			
Servente		2,00	Engenheiro Residente		1,00				
Pedreiro		1,00	Encarregado						
Carpinteiro			Mestre de Obras						
Eletricista			Apontador						
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
Total		3,00	Total		1,00	-			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: Instalação de portais e portas Emassamento de forro em drywall Limpeza de obra									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022							
Órgão Fiscalizador:	SEMESC	Fiscal do Contrato:					PORTARIA CONJUNTA		
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>				
23/11/2022	15/06/2023				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
21/06/2023	204	6			<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV		
DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 15 de junho de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista	3,00	Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
Emassamento de forro em drywall									
Distribuição de rede elétrica									
Reboco em alvenaria									
Limpeza de obra									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM									



 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>					 PREFEITURA <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO PROGRESSO		
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Orgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022			
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>				
23/11/2022	17/06/2023				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
21/06/2023	206	4			<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV		
DIA DA SEMANA :		sábado, 17 de junho de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>-</b>	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
Demolição em alvenaria									
Emassamento massa pva									
Assentamento de pia									
Limpeza de obra									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM									





<b>INVENTORS</b> Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>					 PREFEITURA <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO O PROGRESSO				
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022						
Órgão Fiscalizador:	SEMESC	Fiscal do Contrato:					<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022				
<b>SEMESC</b> Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>						
23/11/2022	20/06/2023				MANHÃ	TARDE	NOITE				
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	1	Prazo Contrato:	210	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
21/06/2023	209	1				<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV		
<b>DIA DA SEMANA :</b>		terça-feira, 20 de junho de 2023									
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>		QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	3,00	Engenheiro Residente	1,00								
Pedreiro	1,00	Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico											
Artífice											
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>			-	<b>Total</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>											
Demolição em alvenaria											
Emassamento em massa pva											
Aparelhamento em alvenaria											
Pintura em metalon											
Pintura em alvenaria											
Limpeza de obra											
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>											
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>											
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM					<hr style="width: 100%;"/>						

 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA					 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA								
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos										
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDICÕES DO TEMPO		
23/11/2022		21/06/2023				1		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:	210	DIAS REST.:	90	Prazo Contrato:	300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
19/09/2023								<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		2,00	Engenheiro Residente		1,00					
Pedreiro		1,00	Encarregado							
Carpinteiro			Mestre de Obras							
Eletricista			Apontador							
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
Total		3,00	Total		1,00			-	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
Demolição em alvenaria										
Pintura em alveria										
Limpeza corredor externo										
Emassamento em massa pva										
Selagem das portas										
Limpeza da obra										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM										

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>										
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022					
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022										
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos												
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		22/06/2023								MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:	211	DIAS REST.:	89	Prazo Contrato:	300	<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
19/09/2023		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 22 de junho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		3,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro		1,00	Encarregado									
Carpinteiro			Mestre de Obras									
Eletricista			Apontador									
Bombeiro Hidraulico												
Artífice												
Total		4,00	Total		1,00		-	Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:												
Remoção de pia												
Pintura metalon												
Aplicação de argamassa												
Rasgo em alvenaria para passagem de drenos												
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO												
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO												
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM												

 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA					 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM					Ordem de Serviço n° 019/2022					
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 23/06/2023		FOLHA:		LIVRO: 1		CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIAS COR.: 212		DIAS REST.: 88		Prazo Contrato: 300		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV <input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 23 de junho de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	3,00	Engenheiro Residente	1,00							
Pedreiro	1,00	Encarregado								
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>			-	<b>Total</b>			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
Pintura metalon										
Instalação de tubulação de dreno										
Vedação em alvenaria da passagem de dreno										
Vedação de passagens antigas dos ar condicionados										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM										







 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022		
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022							
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA							
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 27/06/2023		FOLHA:	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIAS COR.: 216	DIAS REST.: 84	Prazo Contrato: 300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA :	terça-feira, 27 de junho de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS			
Servente		2,00	Engenheiro Residente		1,00				
Pedreiro		1,00	Encarregado						
Carpinteiro			Mestre de Obras						
Eletricista			Apontador						
Bombeiro Hidraulico			Gesseiro		1,00				
Artífice									
Total		3,00	Total		2,00	-			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Instalação das vistas									
Pintura das vistas									
Pintura das portas									
Aplicação de massa para acabamentos									
Instalação de forro farmácia									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-D CREA-AM									



 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b> INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022		
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		FISCAL DO CONTRATO: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA							
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 29/06/2023	FOLHA:	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIAS COR.: 218	DIAS REST.: 82	Prazo Contrato: 300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA :	quinta-feira, 29 de junho de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Gesseiro	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>			-	<b>Total</b>		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Aplicação de massa teto farmacia									
Aplicação de massa teto consultorio									
Instalação de forro enfermagem									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM									



		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>						
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA						
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022		
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS		PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022				
		MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA						
		CAMILA DOS SANTOS MATT						
		Engenheiro da Contratada:						
		STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>				
23/11/2022	01/07/2023		1	MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
19/09/2023	220	80	300	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV		
		DIA DA SEMANA :		sábado, 1 de julho de 2023				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00					
Pedreiro	1,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico								
Artífice								
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>		-	<b>Total</b>		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>								
Pintura das vistas segunda demão								
Pintura teto da farmacia								
Limpeza da obra geral								
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>								
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>								
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM								

 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA				 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO				
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC   Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 02/07/2023		FOLHA:		LIVRO: 1		CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIAS COR.: 221		DIAS REST.: 79		Prazo Contrato: 300		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV
		DIA DA SEMANA :		domingo, 2 de julho de 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente		Engenheiro Residente								
Pedreiro		Encarregado								
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico										
Artífice										
<b>Total</b>	-	<b>Total</b>	-			-	<b>Total</b>			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: Não ouve expediente										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM										

 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022					
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião										
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022										
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:										
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS										
		MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA										
		CAMILA DOS SANTOS MATT										
		Engenheiro da Contratada:										
		STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		03/07/2023								MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:	222	DIAS REST.:	78	Prazo Contrato:	300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
19/09/2023		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 3 de julho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		2,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro		1,00	Encarregado									
Carpinteiro			Mestre de Obras									
Eletricista			Apontador									
Bombeiro Hidraulico												
Artífice												
Total		3,00	Total		1,00			-	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:												
Reboco alvenaria												
Pintura teto enfermagem												
Limpeza da obra												
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO												
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO												
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM												

 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>				 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022						
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022								
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 04/07/2023		FOLHA:		LIVRO:		1		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIAS COR.: 223		DIAS REST.: 77		Prazo Contrato: 300		<input type="checkbox"/> MANHÃ	<input type="checkbox"/> TARDE	<input type="checkbox"/> NOITE		
		DIA DA SEMANA :		terça-feira, 4 de julho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00	EQUIPAMENTOS						
Pedreiro		1,00	Encarregado									
Carpinteiro			Mestre de Obras									
Eletricista			Apontador									
Bombeiro Hidraulico												
Artífice												
Total		2,00	Total		1,00			-		Total		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>												
Reboco alvenaria												
Pintura teto												
Limpeza da obra												
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO												
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO												
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM												

 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>				 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022							
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>											
OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022									
Órgão Fiscalizador: SEMESC  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA											
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 05/07/2023		FOLHA:		LIVRO:		1		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIAS COR.: 224		DIAS REST.: 76		Prazo Contrato: 300		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 5 de julho de 2023									
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		EQUIPAMENTOS		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente		1,00		Engenheiro Residente		1,00		EQUIPAMENTOS					
Pedreiro				Encarregado									
Carpinteiro				Mestre de Obras									
Eletricista				Apontador									
Bombeiro Hidraulico													
Artifice													
Total		1,00		Total		1,00				-		Total	
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>													
Limpeza geral da obra Limpeza de pias													
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>													
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>													
<b>CONTRATADA</b>							<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM													

 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>				 PREFEITURA <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO PROGRESSO					
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>									
		<b>OBJETO:</b>	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço n° 019/2022								
Órgão Fiscalizador:	SEMESC		Fiscal do Contrato:				PORTARIA CONJUNTA  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022				
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>					
23/11/2022	06/07/2023				1	MANHÃ		TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	225	DIAS REST.:	75	Prazo Contrato:	300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
19/09/2023	DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 6 de julho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>	DESCRIÇÃO				
Servente	1,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro		Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico											
Artífice											
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>-</b>		<b>Total</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>											
<b>Impermeabilização de parede corredor</b>											
<b>limpeza do piso, remoção de tintas e massas</b>											
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>											
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>											
<b>CONTRATADA</b>					<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041963654-0 CREA-AM											

 Engenharia e Representação Ltda		<b>DIÁRIO DE OBRA</b> INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA					 PORTO VELHO CONSTRUINDO O FUTURO						
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião										
Órgão Fiscalizador: SEMESC   Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Contrato N° 16/2022/COJUSA/PGM      Ordem de Serviço nº 019/2022  FISCAL DO CONTRATO: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022						
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		Dia: 07/07/2023		FOLHA:		LIVRO:		1		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIAS COR.: 226		DIAS REST.: 74		PRAZO CONTRATO: 300		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 7 de julho de 2023									
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO							
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00										
Pedreiro		Encarregado											
Carpinteiro		Mestre de Obras											
Eletricista		Apontador											
Bombeiro Hidraulico													
Artífice													
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>			-	<b>Total</b>						
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>													
Limpeza do piso, remoção de tintas e massas Retoque pintura													
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO													
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO													
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO							
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM													

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 PREFEITURA <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO PROGRESSO				
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022				
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022									
Órgão Fiscalizador:	SEMESC	Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos											
INÍCIO CONTRATUAL	23/11/2022	Dia:	08/07/2023		FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	19/09/2023	DIAS COR.:	227	DIAS REST.:	73	Prazo Contrato:	300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
		DIA DA SEMANA :	sábado, 8 de julho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00								
Pedreiro		Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista	4,00	Apontador									
Bombeiro Hidraulico											
Artífice											
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>			-	<b>Total</b>				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Retoque pintura paredes em geral											
Instalação de luminarias e tomadas											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM											

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>										
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>										
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião										
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022										
Órgão Fiscalizador: SEMESC  		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA							<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
INÍCIO CONTRATUAL <b>23/11/2022</b>		Dia: <b>09/07/2023</b>		FOLHA:		LIVRO:		<b>1</b>		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL <b>19/09/2023</b>		DIAS COR.: <b>228</b>		DIAS REST.: <b>72</b>		Prazo Contrato:		<b>300</b>		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
										<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV
		DIA DA SEMANA :		domingo, 9 de julho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	<b>EQUIPAMENTOS</b>		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente			Engenheiro Residente									
Pedreiro			Encarregado									
Carpinteiro			Mestre de Obras									
Eletricista			Apontador									
Bombeiro Hidraulico												
Artífice												
<b>Total</b>		-	<b>Total</b>		-				-	<b>Total</b>		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>												
<b>Não houve expediente</b>												
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>												
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>												
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM												

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato:		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022			
		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>				
23/11/2022	10/07/2023				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
19/09/2023	229	71			<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV		
DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 10 de julho de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro		Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,00</b>		-	<b>Total</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>									
Retoque pintura									
Limpeza da obra									
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>									
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
									
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM									

		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
<b>SEMESC</b> Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		<b>OBJETO:</b> Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		<b>CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM</b>		<b>Ordem de Serviço n° 019/2022</b>			
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA		<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022					
<b>INÍCIO CONTRATUAL</b> 23/11/2022	Dia: 11/07/2023	FOLHA:	LIVRO:	1	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>				
<b>TÉRMINO CONTRATUAL</b> 19/09/2023	DIAS COR.: 230	DIAS REST.: 70	Prazo Contrato:	300	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
<b>DIA DA SEMANA :</b>		terça-feira, 11 de julho de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro		Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Gesseiro	1,00						
Artífice									
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>		<b>-</b>	<b>Total</b>			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Instalação de divisorias em drywall laboratorio									
Remoção de tinta parede corredor									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

 Engenharia e Representação Ltda		<h2 style="text-align: center;">DIÁRIO DE OBRA</h2>					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 28/11/2022					
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião										
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022										
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos												
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO		
23/11/2022		12/07/2023								MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:	231	DIAS REST.:	69	Prazo Contrato:	300	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
19/09/2023		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 12 de julho de 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro			Encarregado									
Carpinteiro			Mestre de Obras									
Eletricista		4,00	Apontador									
Bombeiro Hidraulico												
Artifice												
Total		5,00	Total		1,00			-	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:												
Distribuição de rede elétrica etapa 02												
remoção de tinta parede corredor												
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO												
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO												
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM												

 <p><b>INVENTORS</b> Engenharia e Representação Ltda</p>		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>				 <p><b>PREFEITURA</b> <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO O PROGRESSO</p>					
		<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>									
		<b>OBJETO:</b>		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		<b>CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM</b>			<b>Ordem de Serviço nº 019/2022</b>						
Órgão Fiscalizador: SEMESC   <p><b>SEMESC</b> Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos</p>		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022			
<b>INÍCIO CONTRATUAL</b> 23/11/2022		Dia: 13/07/2023		FOLHA:		LIVRO: 1		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>			
<b>TÉRMINO CONTRATUAL</b> 19/09/2023		DIAS COR.: 232		DIAS REST.: 68		Prazo Contrato: 300		<input type="checkbox"/> MANHÃ <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> TARDE <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> NOITE <input type="checkbox"/> CHUV	
		<b>DIA DA SEMANA :</b>		quinta-feira, 13 de julho de 2023							
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00						
Pedreiro			Encarregado								
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista			Apontador								
Bombeiro Hidraulico			Gesseiro		1,00						
Artífice			técnico refrigeração		2,00						
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>Total</b>		<b>4,00</b>			<b>-</b>	<b>Total</b>		
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>											
Instalação de divisórias em drywall											
Passagem de tubos de refrigeração											
Remoção de tinta parede corredor											
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>											
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>											
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM											

 <p><b>INVENTORS</b> Engenharia e Representação Ltda</p>		<b>DIÁRIO DE OBRA</b>					 <p><b>PREFEITURA</b> <b>PORTO VELHO</b> CONSTRUINDO O FUTURO</p>					
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
		<b>OBJETO:</b>		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						<b>CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM</b>		<b>Ordem de Serviço nº 019/2022</b>
Órgão Fiscalizador: SEMESC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					<b>PORTARIA CONJUNTA</b>  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022					
<b>SEMESC</b> Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Dia: 14/07/2023		FOLHA:		LIVRO:		1		<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
INÍCIO CONTRATUAL 23/11/2022		DIAS COR.: 233		DIAS REST.: 67		Prazo Contrato: 300		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUV		
TÉRMINO CONTRATUAL 19/09/2023		DIA DA SEMANA : sexta-feira, 14 de julho de 2023										
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>		<b>QUANT.</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro			Encarregado									
Carpinteiro			Mestre de Obras									
Eletricista			Apontador									
Bombeiro Hidraulico			Gesseiro		1,00							
Artífice												
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>Total</b>		<b>2,00</b>		<b>-</b>	<b>Total</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>												
Aplicação de massa pva divisórias												
Remoção de tinta parede corredor												
Limpeza piso, remoção de tinta e massa												
<b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>												
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>												
<b>CONTRATADA</b>						<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM												



 Engenharia e Representação Ltda		DIÁRIO DE OBRA					 PORTO VELHO CONSTRUINDO O PROGRESSO		
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022							
Órgão Fiscalizador:	SEMESC	Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA  Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA  28/11/2022		
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos									
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
23/11/2022	16/07/2023				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	300	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
19/09/2023	235	65			<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV	<input type="checkbox"/> CHUV		
DIA DA SEMANA :		domingo, 16 de julho de 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente		Engenheiro Residente							
Pedreiro		Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico									
Artífice									
Total	-	Total	-			-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Não ouve expediente									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM					_____				



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/06/2023 07:25:13.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GFe6Pv893SG00000.SFP é:

944f42ef-5947-4ec5-8693-a6023349fcbc

Transmissor: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL LTDA:32709998000194,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 32709998000194

Responsável: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL EIRE

Inscrição do Responsável: 76525040230

Competência: 05/2023

NRA: GFe6Pv893SG00000

Base de Processamento: Manaus / AM

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILMAR ANTONY

Telefone: 009291475369

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD  
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS:2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO  
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO ANDRE DA SILVA			201.32674.27-5	22/11/2022	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00
GLENDIA LIMA DE OLIVEIRA			270.29609.99-4	01/05/2023	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00
JONISON DA SILVA MATIAS			136.99386.54-5	22/11/2022	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.109,25 0,00 0,00 315,27 328,74 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2023  
HORA: 07:22:03  
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD  
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS:2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO N° DE CONTROLE: HsGDTw6mMjM0000-3  
N° ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0  
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45  
LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000  
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00
TOTAIS:	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2023  
HORA: 07:22:03  
PÁG : 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD  
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS:2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO Nº DE CONTROLE: HsGDTw6mMjM0000-3  
Nº ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0  
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000  
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 0092 1467 2949 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	315,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	315,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2023  
HORA: 07:22:03  
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: LmHg34XJb130000-8 N° ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0  
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000  
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00
TOTAIS:	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2023  
HORA: 07:22:03  
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD	Nº DE CONTROLE: LmHg34XJb130000-8	Nº ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161	BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663		CNAE: 7112000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.109,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
328,74	0,00	0,00	0,00	328,74

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2023  
HORA: 07:22:03  
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: LmHg34XJb130000-8 N° ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0  
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS:2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42  
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000  
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 0092 1467 2949 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	315,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	315,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: LmHg34XJb130000-8  
COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PORTO VELHO INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45 N° CONTROLE: HsGDTw6mMjM0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
AV SETE DE SETEMBRO 237 CENTRO PORTO VELHO 76801045 RO

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	328,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: LmHg34XJb130000-8  
COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	328,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/06/2023  
HORA: 07:22:03  
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° CONTROLE: LmHg34XJb130000-8 N° ARQUIVO: GFe6Pv893SG0000-0  
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 92-14672949 CNAE: 7112000  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27	
OUTRAS ENTIDADES						
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>30.106.351/0001-42</b>	Razão Social <b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23158.2619497-2</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000138565549</b>			Valor Total do Documento <b>310,41</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	310,41			310,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	<b>Totais</b>	<b>310,41</b>			<b>310,41</b>

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 08:31:27

85890000003 4 10410385231 9 71071623158 3 26194972049 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4	10410385231 9	71071623158 3	26194972049 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 30.106.351/0001-42  
Número: 07.16.23158.2619497-2  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 310,41

Pague com o PIX





## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>30.106.351/0001-42</b>	Razão Social	<b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA</b>		
Período Apuração	<b>01/05/2023</b>	Data de Vencimento	<b>20/06/2023</b>	Número do Documento	<b>07162315826194972</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	310,41	-	-	310,41
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
<b>Totais</b>		<b>310,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,41</b>

Banco	<b>Documento pago via PIX</b>	Data de Arrecadação	<b>20/06/2023</b>	
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	<b>0,00</b>	Referência

Comprovante emitido às **17:25:36** de **26/07/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **9006.64fc.72bb.23c3.a087.d705.9c95.3f22**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/06/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 07:22:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD

INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42

COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 2  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.109,25

DEPÓSITO

328,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

328,74  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/06/2023 - 07:22:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092)14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 328,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/06/2023 - 07:22:03

GFIP - SEFIP 8.40


01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092)14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 328,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000032 287401802300 607677180832 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Pagamento de Convênio

## R\$ 328,74

### Sobre a transação

Data de vencimento	07/06/2023
Data da transação	07/06/2023
Horário	17h16
Valor original	R\$ 328,74
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Acréscimo	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 328,74

### Código de barras

8588000000322874018023006076771808320106351000  
18

### Autenticação

9315873937493749374000003287429

Descrição **Pagamento**

### Quem pagou

Nome **INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACA**

Conta **101999577**

Agência **0001**

Instituição **Banco Inter**

### Quem recebeu

Nome **FGTS GRF CONVENIO 180**

## Folha de Pagamento

Empresa: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 30.106.351/0001-42

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2023

Emissão: 07/06/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000001	ANTONIO ANDRE DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
		310 INSS	9%		103,47	
				<u>1.369,75</u>	<u>103,47</u>	
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:		1.266,28	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75
000003	GLENDIA LIMA DE OLIVEIRA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
		310 INSS	9%		103,47	
				<u>1.369,75</u>	<u>103,47</u>	
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:			1.266,28
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2023	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75
000002	JONISON DA SILVA MATIAS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
		310 INSS	9%		103,47	
				<u>1.369,75</u>	<u>103,47</u>	
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:			1.266,28
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75
<b>Total Geral</b>	(3 empregados)					
		011 Salário-Base		4.109,25		
		310 INSS			310,41	
				<u>4.109,25</u>	<u>310,41</u>	
		FGTS: 328,74	Líquido a receber:			3.798,84
		BC-INSS: 4.109,25	BC-FGTS: 4.109,25			



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/07/2023 11:43:19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ag7HZkGFDY900000.SFP é:

aaf93adc-f051-4ca2-8f6b-6597680a5530

Transmissor: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL LTDA:32709998000194,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 32709998000194

Responsável: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL EIRE

Inscrição do Responsável: 76525040230

Competência: 06/2023

NRA: Ag7HZkGFDY900000

Base de Processamento: Manaus / AM

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILMAR ANTONY

Telefone: 009291475369

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000038 287401802300 707678180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: Ag7HZkGFDY90000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: CLK0zYbvMXA0000-9  
COD REC: 150 COMP: 06/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PORTO VELHO INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45 N° CONTROLE: IvY98JfDFMY0000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
AV SETE DE SETEMBRO 237 CENTRO PORTO VELHO 76801045 RO

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	328,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000038 287401802300 707678180832 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: Ag7HZkGFDY90000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: CLK0zYbvMXA0000-9  
COD REC: 150 COMP: 06/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	328,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/07/2023  
HORA: 11:34:48  
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° CONTROLE: CLK0zYbvMXA0000-9 N° ARQUIVO: Ag7HZkGFDY90000-0  
COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 92-14672949 CNAE: 7112000  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>30.106.351/0001-42</b>	Razão Social <b>INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA</b>		
Período de Apuração <b>01/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23207.7823929-7</b>	Pagar este documento até <b>26/07/2023</b>
Observações <b>web v3.2.0</b>			Valor Total do Documento <b>316,55</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	310,41	6,14		316,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>310,41</b>	<b>6,14</b>		<b>316,55</b>

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

26/07/2023 17:37:02

8581000003 0 16550385232 6 07071623207 4 78239297457 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000003 0	16550385232 6	07071623207 4	78239297457 5
--------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 30.106.351/0001-42  
Número: 07.16.23207.7823929-7  
Pagar até: 26/07/2023  
Valor: 316,55

Pague com o PIX



**inter**

# Pix enviado

## R\$ 316,55

### Sobre a transação

Data do pagamento **Quarta, 26/07/2023**

Horário **17h43**

Identificador  
**MaXHlrIVOFK6CfbRDPefcdS4ciCnn3n0qVn**

ID da transação  
**E00416968202307262043u6kSLEFBzQO**

### Quem recebeu

Nome **Ministerio da Economia**

CPF/CNPJ **00.394.460/0058-87**

Instituição **Bco do Brasil S.A.**

### Quem pagou

Nome **STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA 013537742**

CPF/CNPJ **41.950.443/0001-20**

Instituição **Banco Inter S.A.**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/07/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 11:34:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD

INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42

COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 2  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.109,25

DEPÓSITO

328,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

328,74  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/07/2023 - 11:34:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092)14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 328,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858000000038 287401802300 707678180832 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/07/2023 - 11:34:48

GFIP - SEFIP 8.40


01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092)14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 328,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858000000038 287401802300 707678180832 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Folha de Pagamento

Empresa: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 30.106.351/0001-42

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 07/07/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000001	ANTONIO ANDRE DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação			547,90	
		310 INSS	9%		103,47	
				<u>1.369,75</u>	<u>651,37</u>	
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:		718,38	
		Data: ____/____/____	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75

000003	GLENDALIMA DE OLIVEIRA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação			547,90	
		310 INSS	9%		103,47	
				<u>1.369,75</u>	<u>651,37</u>	
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:		718,38	
		Data: ____/____/____	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2023	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75

000002	JONISON DA SILVA MATIAS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação			547,90	
		310 INSS	9%		103,47	
				<u>1.369,75</u>	<u>651,37</u>	
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:		718,38	
		Data: ____/____/____	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75

<b>Total Geral</b> (3 empregados)					
		011 Salário-Base		4.109,25	
		300 Adiantamento Compensação			1.643,70
		310 INSS			310,41
				<u>4.109,25</u>	<u>1.954,11</u>
		FGTS: 328,74	Líquido a receber:		2.155,14
		BC-INSS: 4.109,25	BC-FGTS: 4.109,25		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA**  
**CNPJ: 30.106.351/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:26:01 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **6D77.10BF.73C0.EF8E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**171978/2023**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA**  
ENDEREÇO : **RUA DAS COPAÍBAS, Nº: 161, CEP: 69082663**  
BAIRRO : **COROADO** COMPLEMENTO: ,  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **40649901**  
CNPJ/CPF : **30106351000142**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

**13/07/2023**

Tributos

\*\*\*\*\* **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 11/10/2023**



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO**

**CND Nº171978/2023**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **368.E81.E6F.CC2**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 13/07/2023

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 30.106.351/0001-42

**Razão Social:** INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA

**Endereço:** R DAS COPAIBAS 161 / COROADO / MANAUS / AM / 69082-663

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/07/2023 a 06/08/2023

**Certificação Número:** 2023070802124352730536

Informação obtida em 13/07/2023 20:12:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

**Certidão Nº:** 52471494  
**Data:** 13/07/2023  
**Hora:** 19:08:42  
**Válida até:** 12/08/2023

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**C.N.P.J:** 30.106.351/0001-42 - INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA

**Inscrição:** 05.401.122-1 - **Situação:** Ativo

**CNAE:** 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 006952989**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 12/07/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, residente na RUA DAS COPAIBAS 161, CONJ ACARIQUARA, COROADO, CEP: 69082-663, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 30.106.351/0001-42. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 13 de julho de 2023.

**PEDIDO Nº:**

**0006952989**





Assinado por **Eronildo Gomes Dos Santos** - Secretário Municipal Adjunto de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos -

Em: 01/08/2023, 12:23:01
